



**H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
PROGRAMA ANUAL DE SEGUIMIENTO 2020  
INFORME TRIMESTRAL  
JULIO A SEPTIEMBRE**

**Contenido**

1.- Introduccion.....	2
2.-Objetivo.....	2
3.- Fundamento Juridico.....	2
4.- Metodología General de Seguimiento.....	2
5.- Notas Metodológicas.....	4
6.- Fondos y/o Programas sujetos a Seguimiento y/o monitoreo trimestral .....	5
7.- Análisis y Resultados.....	6
8.- Valoración general de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.....	36
9.- Seguimiento. - Aspectos Susceptibles de Mejora.....	37





## 1.- Introducción

Los resultados obtenidos mediante el seguimiento y evaluación permiten orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así como determinar y aplicar las medidas que se requieran para consolidar programas eficientes y eficaces.

En el artículo 6° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se establece la atribución para la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, respecto al control y la evaluación del gasto; además en los artículos 78 y 79 de la misma ley se establece la facultad a la Contraloría Municipal para efectuar evaluaciones del desempeño que se realizarán a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos; así mismo, de verificar periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos, con base en el sistema de evaluación del desempeño, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Municipal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

## 2.- Objetivo

De acuerdo al Artículo 20 de los Lineamientos generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de Tamasopo, S.L.P.

El Subsistema de Seguimiento tiene los siguientes objetivos:

I. Monitorear los avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los instrumentos de planeación;

II. Emitir informes de evaluación trimestrales sobre los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos a fin de identificar el grado de eficacia, eficiencia, economía y calidad en la administración pública municipal y el impacto social del ejercicio del gasto público y,

III. Generar información para la integración de los informes de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el Informe de Gobierno y la Cuenta Pública.

## 2.- Fundamento Jurídico

Artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 4 fracción XII, 61 fracción II inciso c) y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 75, 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículos 6 fracción II y V, 29, 31 y 39 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de Tamasopo S.L.P. y Programa anual de Seguimiento 2020 del municipio de Tamasopo S.L.P.

## 4.- Metodología General de Seguimiento

### I. Indicadores

La evaluación de eficacia, eficiencia, economía y calidad es realizada por trabajo de gabinete y trabajo de campo en los casos necesarios. Así, el presente informe incluye un análisis de acuerdo con el criterio analizado, conforme al siguiente listado:

**Eficacia:** Analiza el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Metas Alcanzadas

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Metas Alcanzadas}}{\text{Metas Programadas}} \times 100$$



### Metas Programadas

Para la valoración del cumplimiento de las metas y/u objetivos, se establecen los siguientes parámetros:

#### Parámetros de valoración de Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia => 85%	85% > Eficacia > 70%	Eficacia < 70%

**Economía:** Mide la capacidad de la unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. De forma trimestral se recomienda calcularlo de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Economía} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

Para la valoración de la economía, se establecen los siguientes parámetros:

#### Parámetros de valoración de Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía = > 85%	85% > Economía > 70%	Economía < 70%

**Eficiencia:** Mide la relación entre el logro de objetivos del Programa presupuestario (Pp) y los recursos utilizados para su cumplimiento. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Eficacia}}{\text{Economía}} \times 100$$

Para la valoración de la eficiencia, se establecen los siguientes parámetros y requisitos:

Valoración	Parámetro	Requisitos
Adecuado	125% =< Eficiencia => 85%	Eficacia => 85% Economía => 85%
Atención Operacional	100% =< Eficiencia => 70%	85% < Eficacia => 70% 85% < Economía => 70%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	Eficacia < 70% Economía < 75%

**Calidad:** Capacidad de una entidad de carácter público para prestar bienes y servicios que respondan a las problemáticas de las diferentes realidades municipales.

$$\text{Calidad} = \frac{\text{Beneficiarios satisfechos}}{\text{Total de Beneficiarios}} \times 100$$



La metodología anterior podrá ser modificada de acuerdo con las características específicas de cada Programa presupuestario (PP).

## **II. Momentos Contables de acuerdo con el CONAC**

**Gasto Modificado:** El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

**Gasto Comprometido:** El gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

**Gasto Devengado:** El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Gasto Ejercido:** El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

## **5.- Notas Metodológicas.**

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa <de cada cien unidades>.
- b) Al ser evaluaciones trimestrales, la metodología establecida en el punto cuatro considera de igual manera valoraciones máximas trimestrales. Así, para lo anterior, todo resultado de eficacia, eficiencia, economía y calidad ha sido ponderado a esta medición.

**Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al máximo señalados en los parámetros de valoración anteriormente mencionados.**

c) Posterior al cálculo ponderado de la Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

- Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- Para el caso de la eficiencia, es erróneo interpretar un excedente como una situación favorable, dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía.
- Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.




6.- Fondos y/o Programas sujetos a Seguimiento y/o monitoreo trimestral

N°	Fondo o Pp	Dependencia, Entidad u Órgano
1	2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE	CODESOL
2	2020-2071 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 2 AGUA PUERCA	CODESOL
3	2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO	CODESOL
4	2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA	CODESOL
5	2020-2282 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE EL VIEJO	CODESOL
6	2020-2558 AMPLIACION DE BANQUETA TAMASOPO-AGUA BUENA EN TAMASOPO	CODESOL
7	2020-2571 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE EN TAMASOPO	CODESOL
8	2020-3150 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL	CODESOL
9	2020-3153 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL	CODESOL
10	2020-3154 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 7 EN TAMASOPO	CODESOL
11	2020-3155 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4.5 mts. EN ZONA 8 - TAMBACA	CODESOL
12	2020-2039 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	ESTIMULOS A LA EDUCACION
13	2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.	SMDIF
14	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO	SMDIF
15	2020-2158 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA SUR-TAMASOPO	SMDIF




7.- Análisis y resultados



<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1806
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/04/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	870,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	148
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

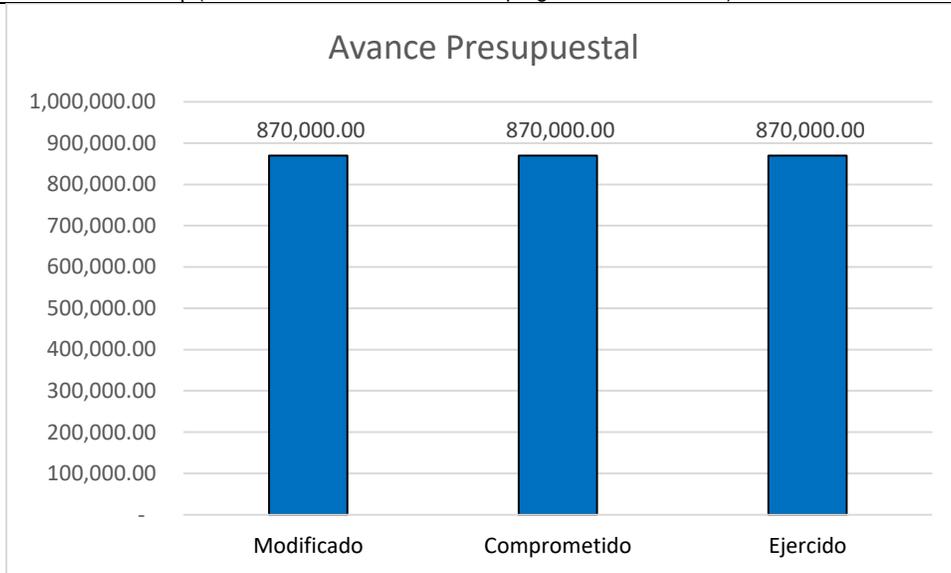

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal



Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

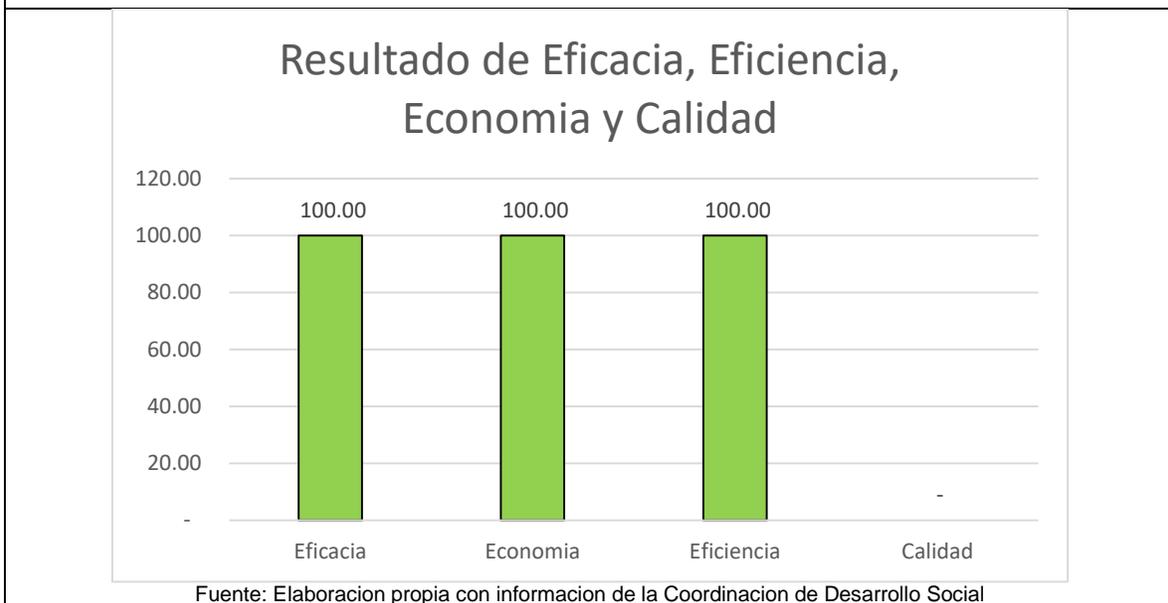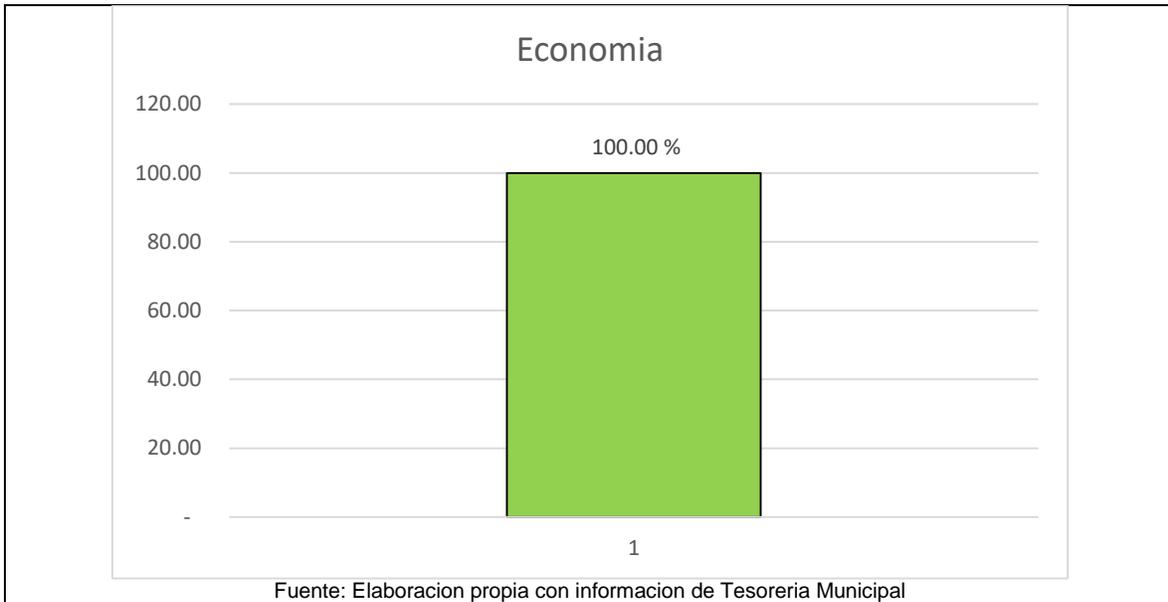


**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%





<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 2 AGUA PUERCA
<b>Clave del Pp:</b>	O1807
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/04/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	1,218,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	148
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

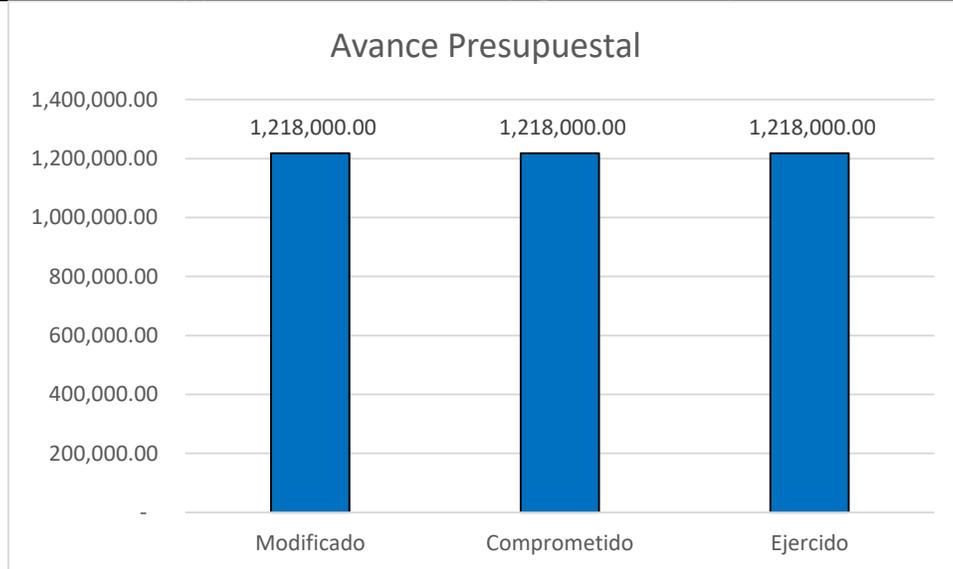

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

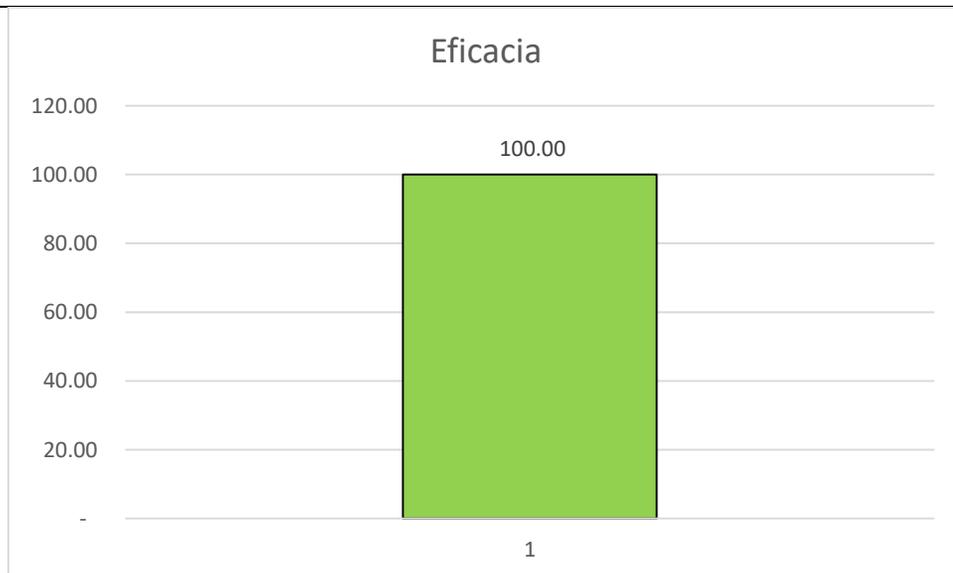

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

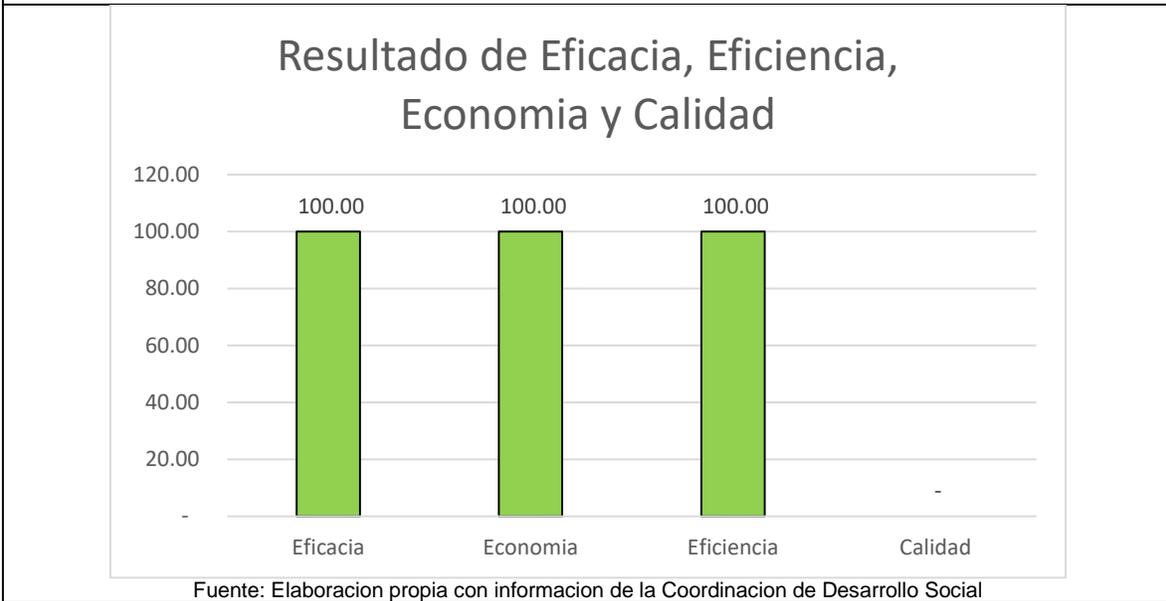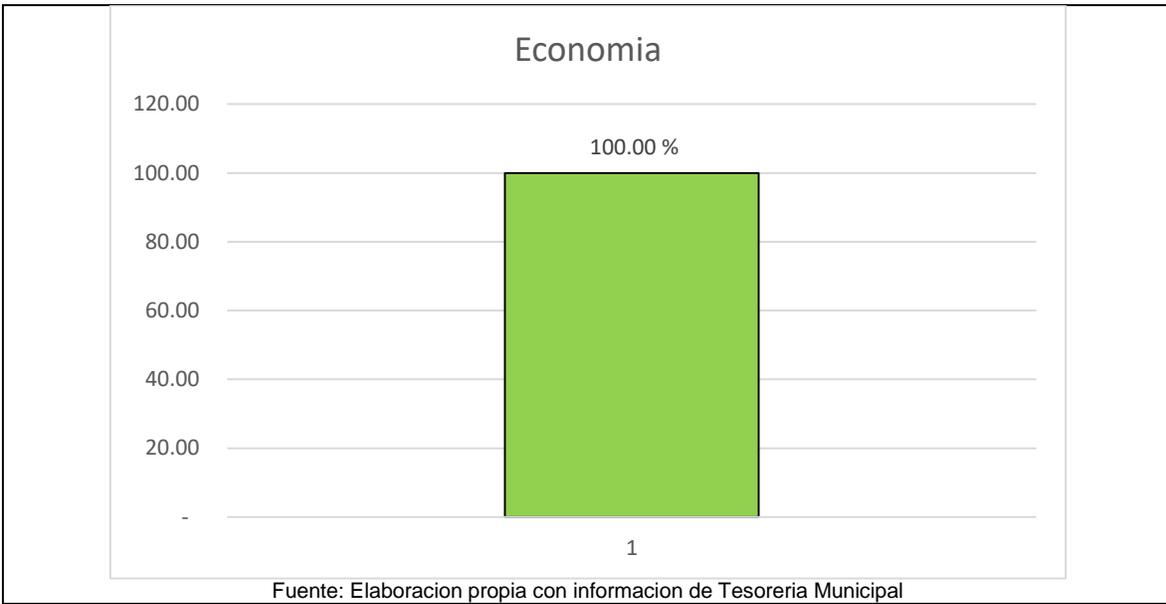


Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%





<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1808
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/04/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	1,218,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	148
<b>Algoritmo del indicador</b>	<b>(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100</b>

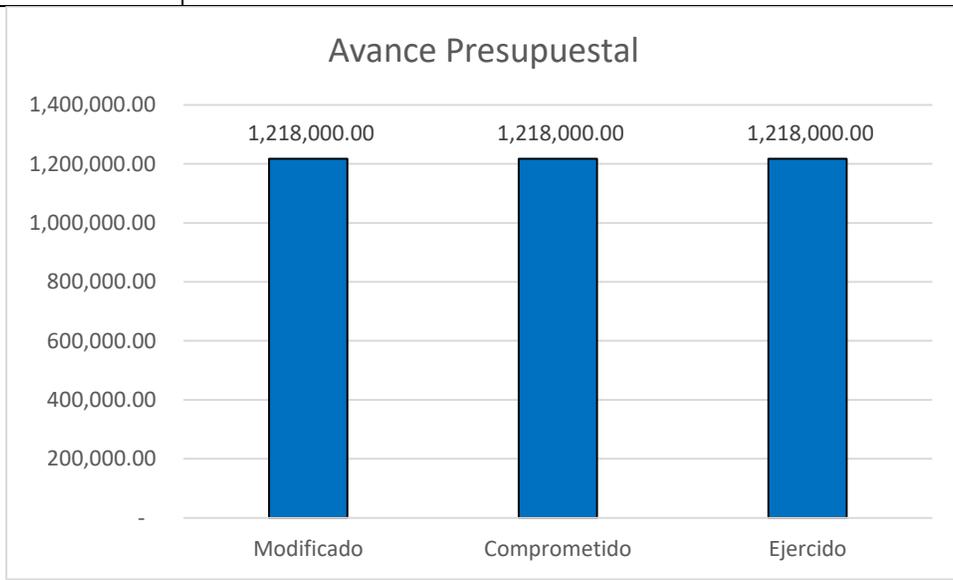

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

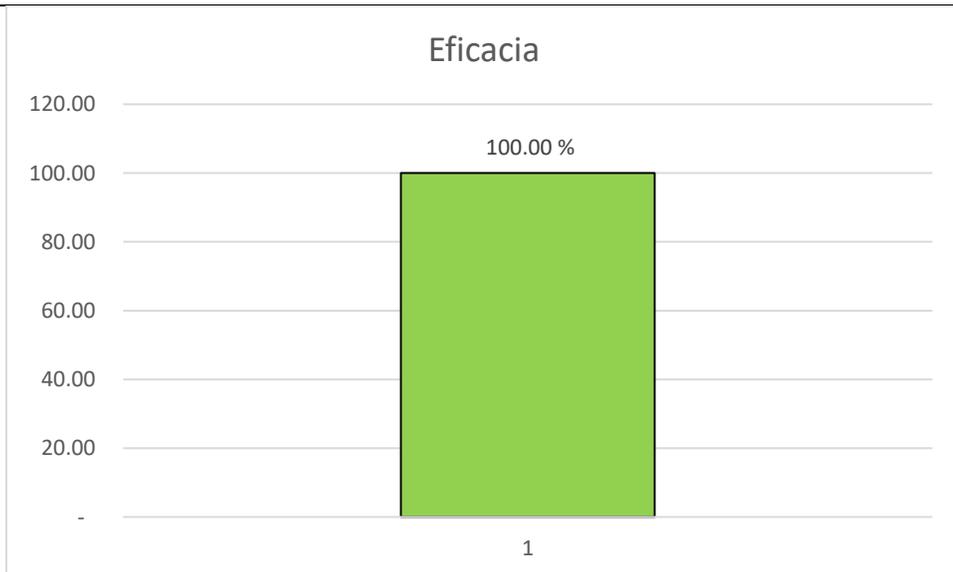

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

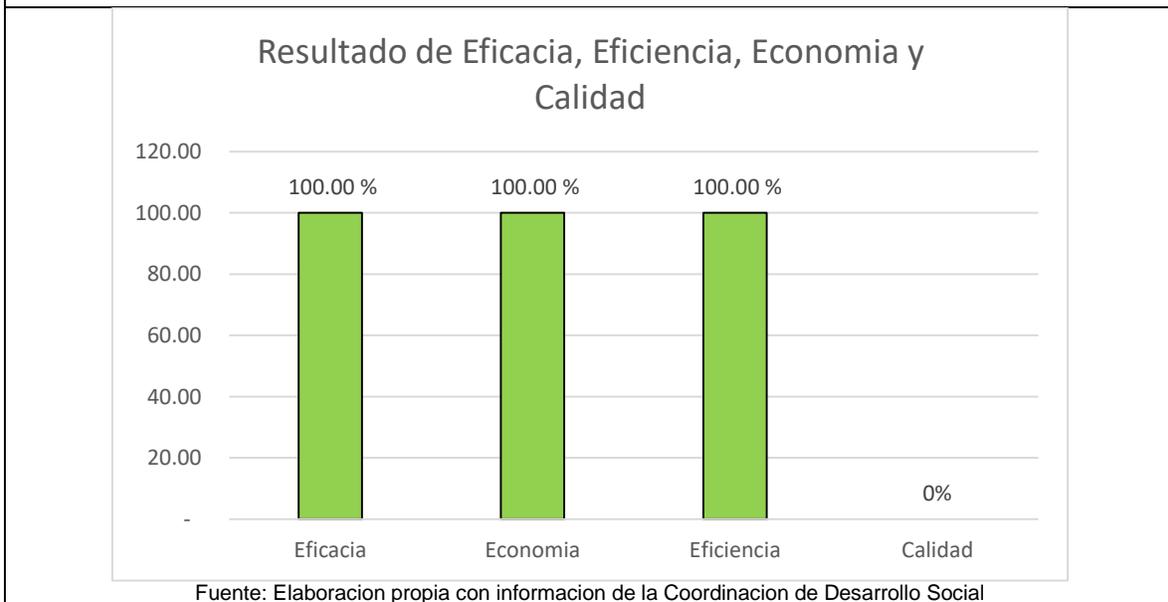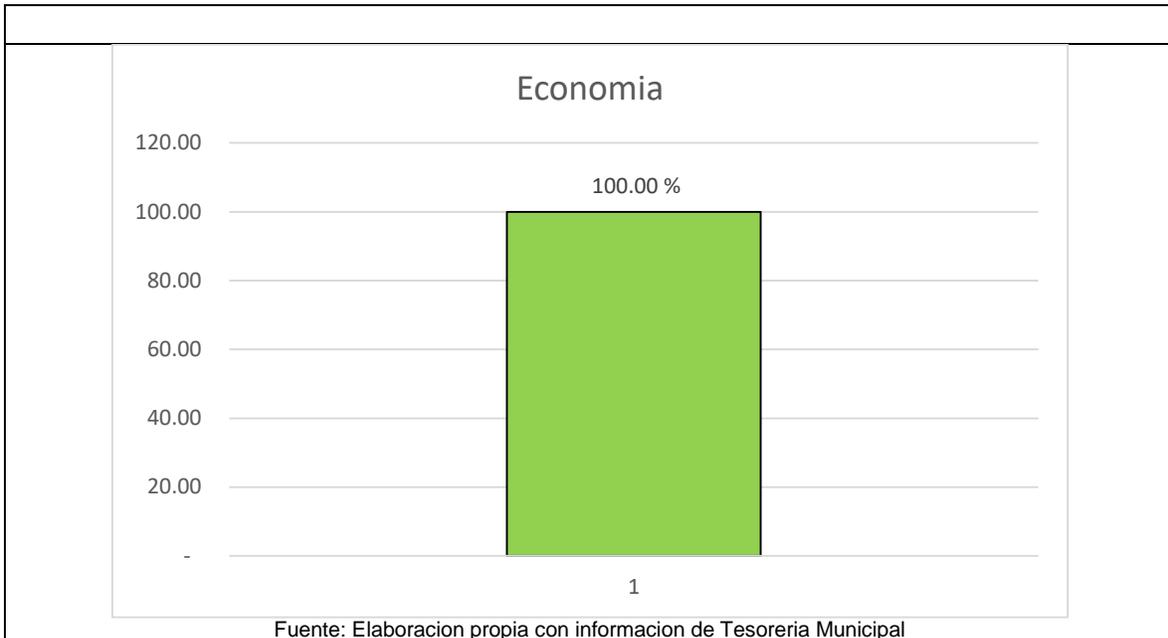


**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%



<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1809
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/04/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	1,044,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	148
<b>Algoritmo del indicador</b>	<b>(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100</b>

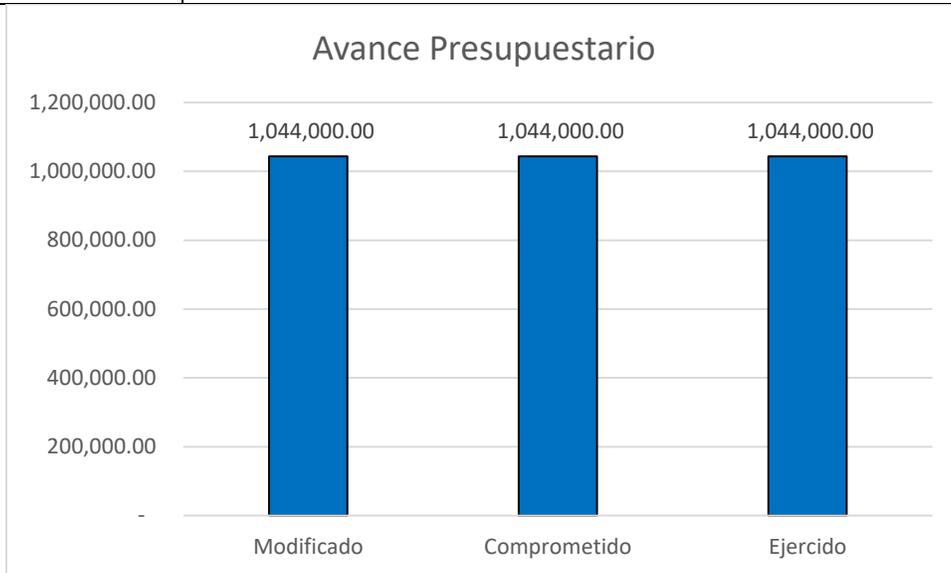


Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

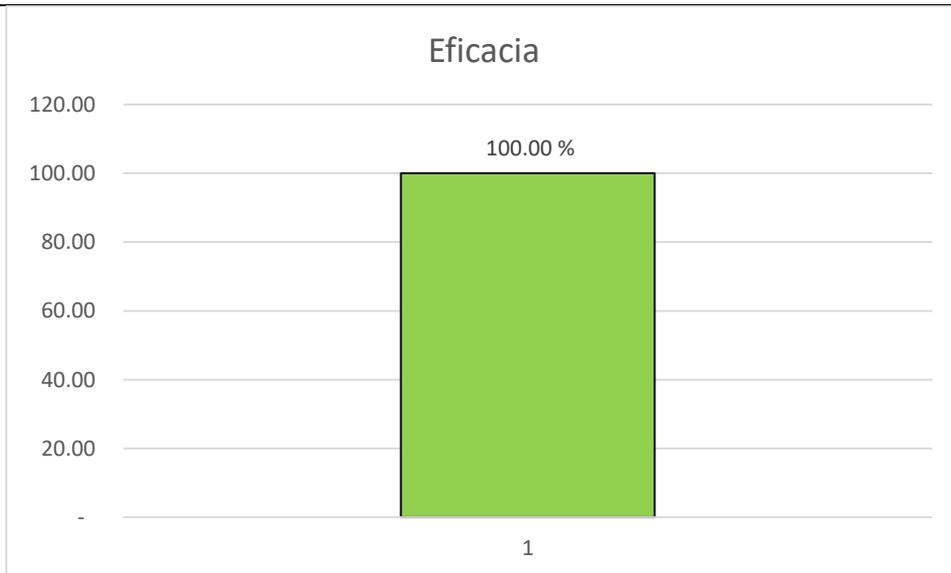




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

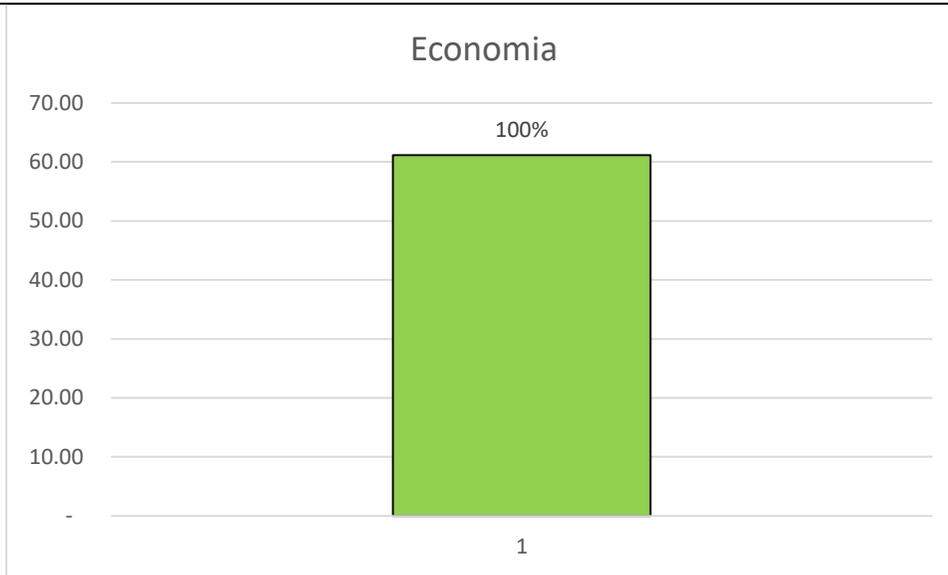

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal





Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%




<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-2282 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE EL VIEJO</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1915
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	01/05/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	833,576.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	92
<b>Algoritmo del indicador</b>	<b>(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100</b>

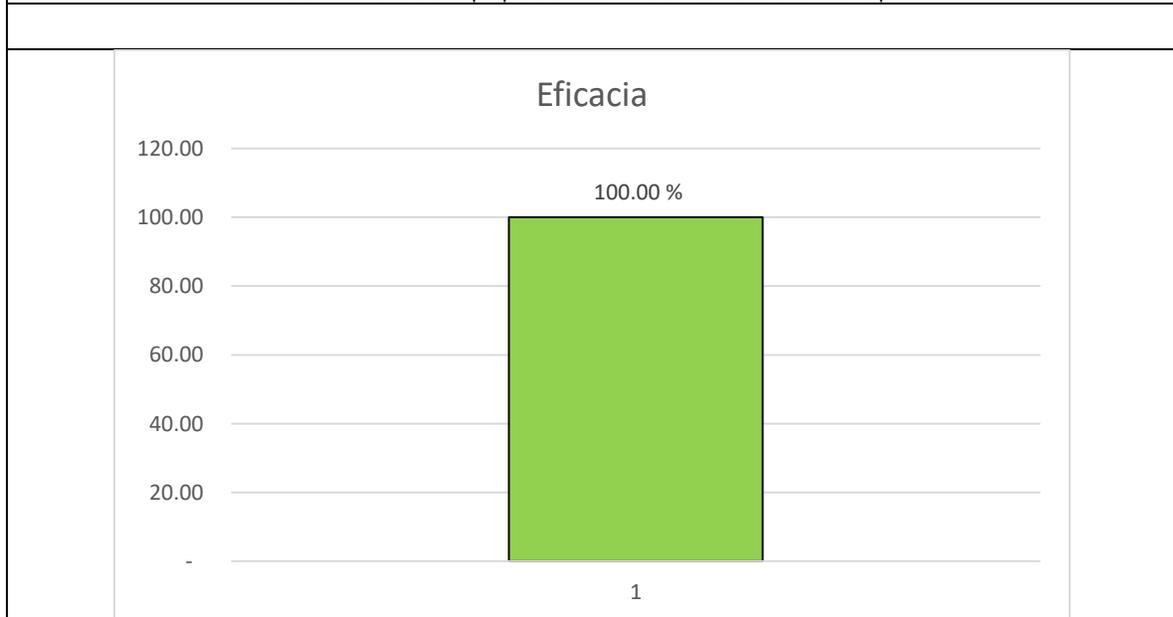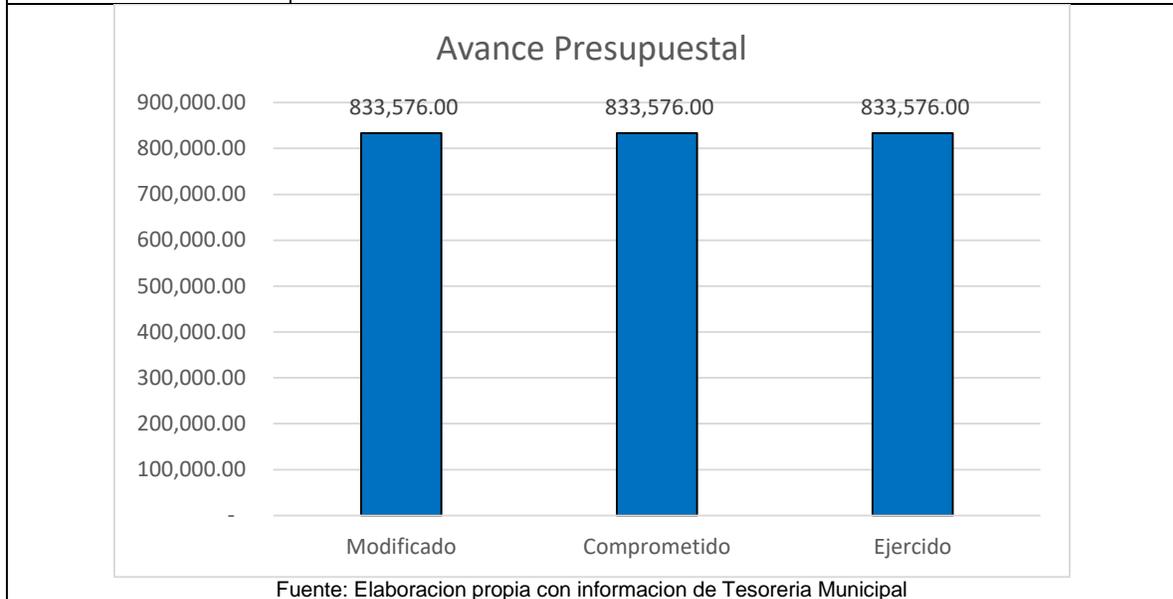




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

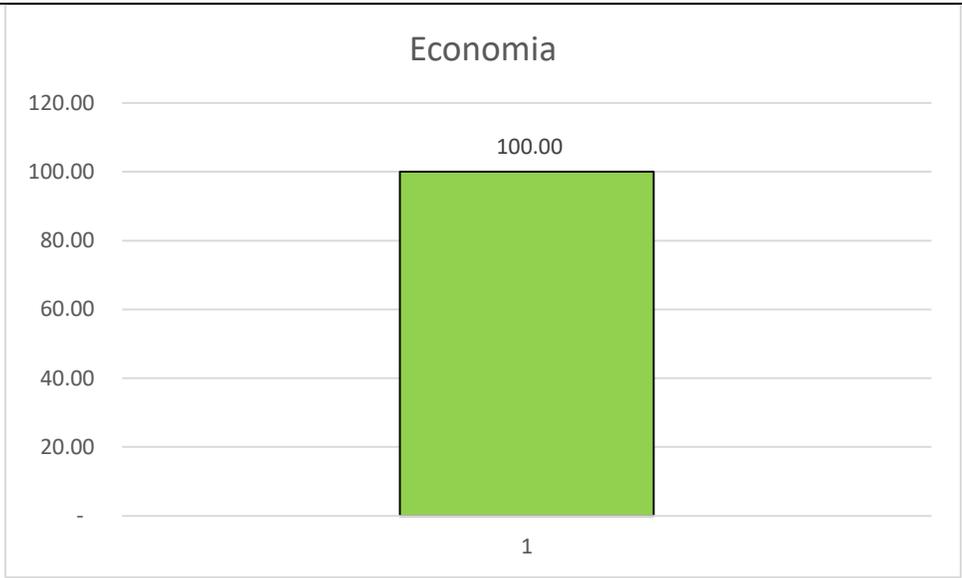

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

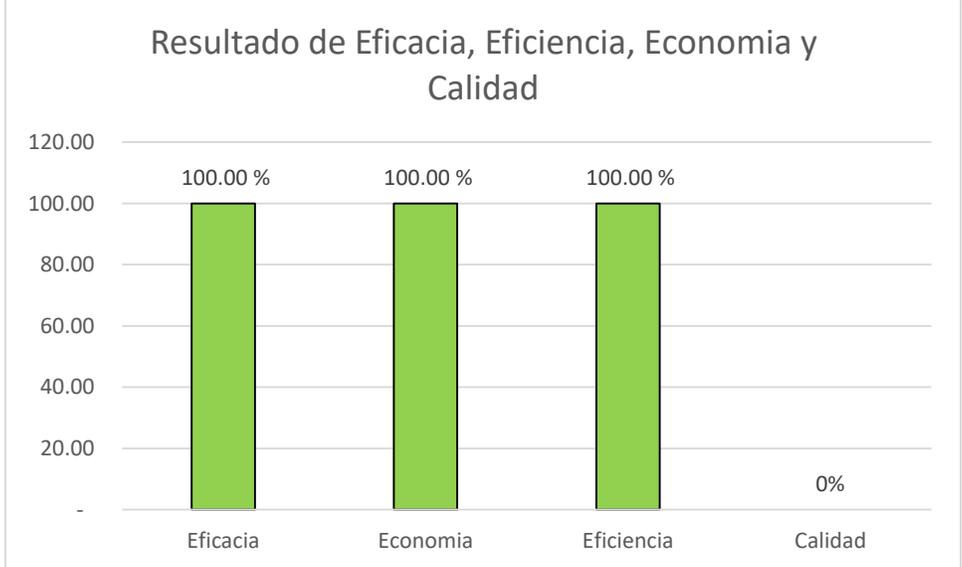


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%





<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2558 AMPLIACION DE BANQUETA TAMASOPO-AGUA BUENA EN TAMASOPO
<b>Clave del Pp:</b>	O2017
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	05/08/2020
<b>Objetivo:</b>	Dotar de infraestructura básica a los espacios públicos de las principales poblaciones del municipio, que permita a la ciudadanía el acceso a la convivencia urbana, la cultura, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho a la ciudad; regular el crecimiento urbano de las poblaciones del municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; así como de proporcionar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos básicos
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	0.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	149
<b>Algoritmo del indicador</b>	$(\text{avance real de la obra} / \text{avance programado de la obra}) \times 100$

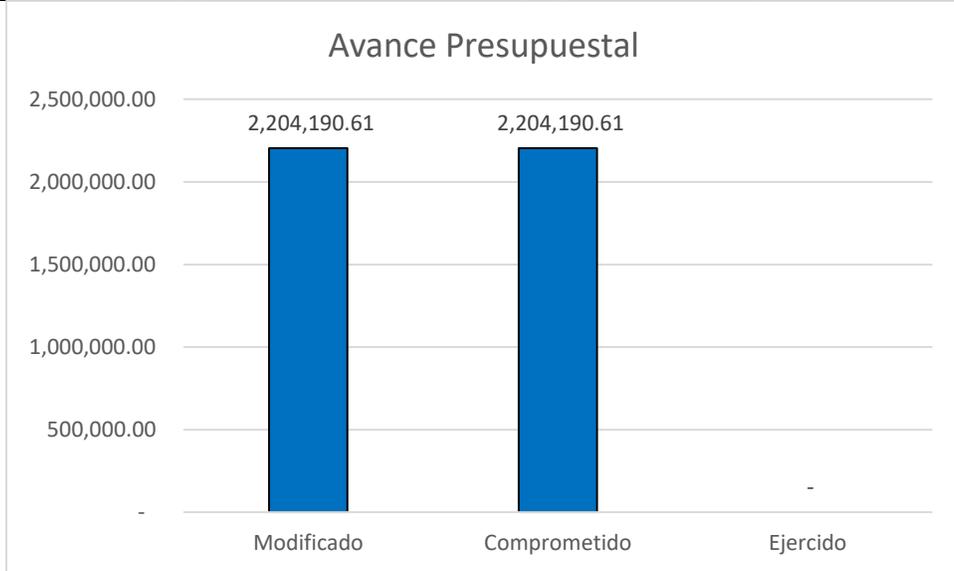

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

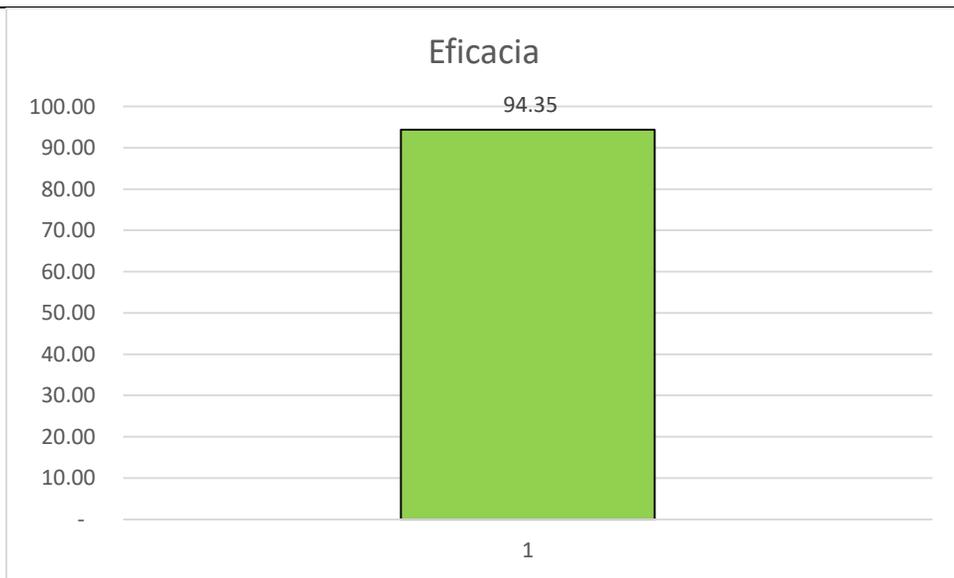

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social




**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado del 0%</li> </ul>	Economía < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 0%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:



<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2571 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE EN TAMASOPO
<b>Clave del Pp:</b>	O2018
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/07/2020
<b>Objetivo:</b>	Dotar de infraestructura básica a los espacios públicos de las principales poblaciones del municipio, que permita a la ciudadanía el acceso a la convivencia urbana, la cultura, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho a la ciudad; regular el crecimiento urbano de las poblaciones del municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; así como de proporcionar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos básicos
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	0.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	117
<b>Algoritmo del indicador</b>	$(\text{avance real de la obra} / \text{avance programado de la obra}) \times 100$

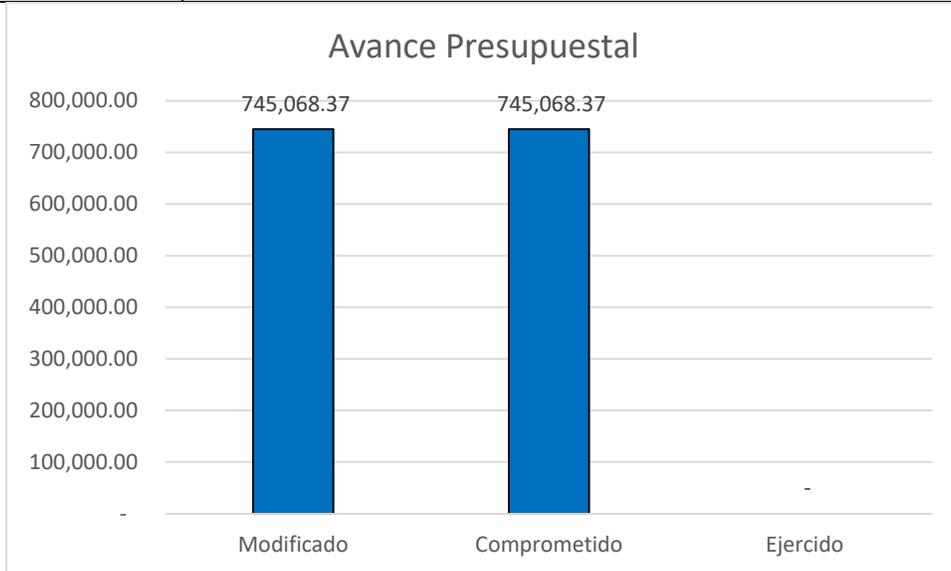

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

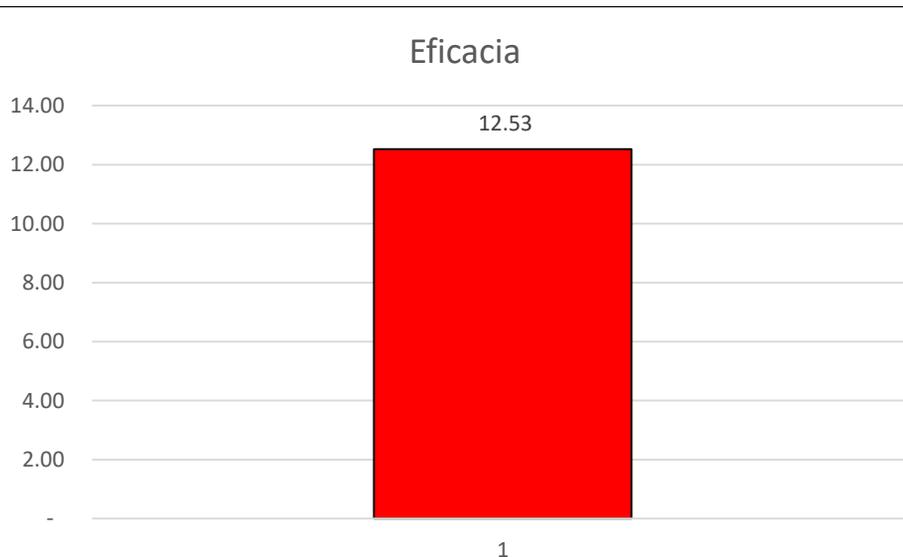




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social



Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

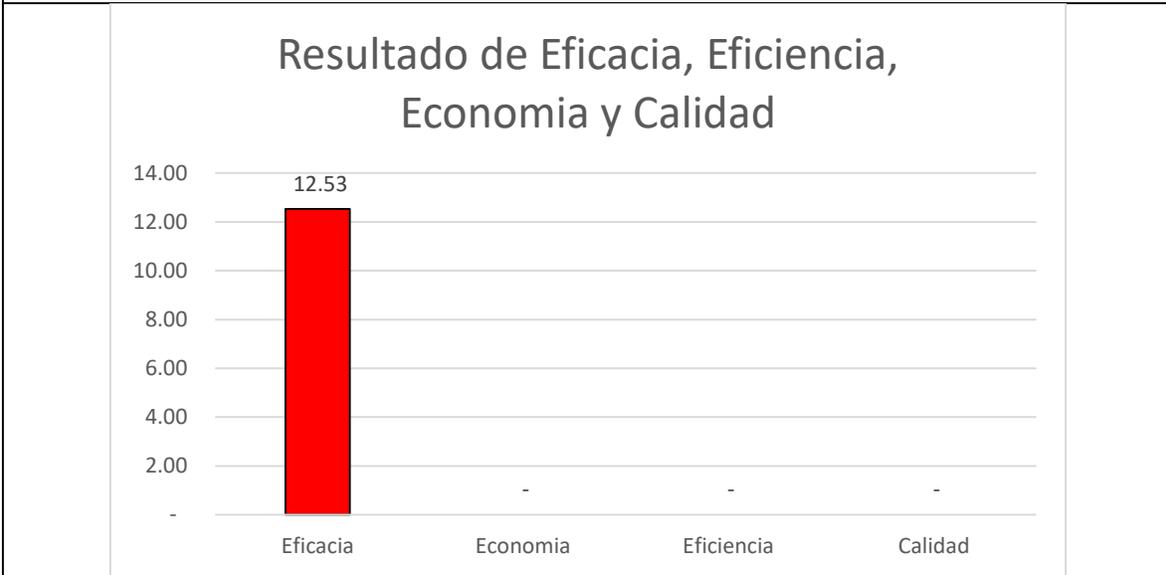


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 12.53%</li> </ul>	Eficacia < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado del 0%</li> </ul>	Economía < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 0%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:





<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-3150 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1810
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	04/05/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	735,223.43
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	150
<b>Algoritmo del indicador</b>	<b>(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100</b>

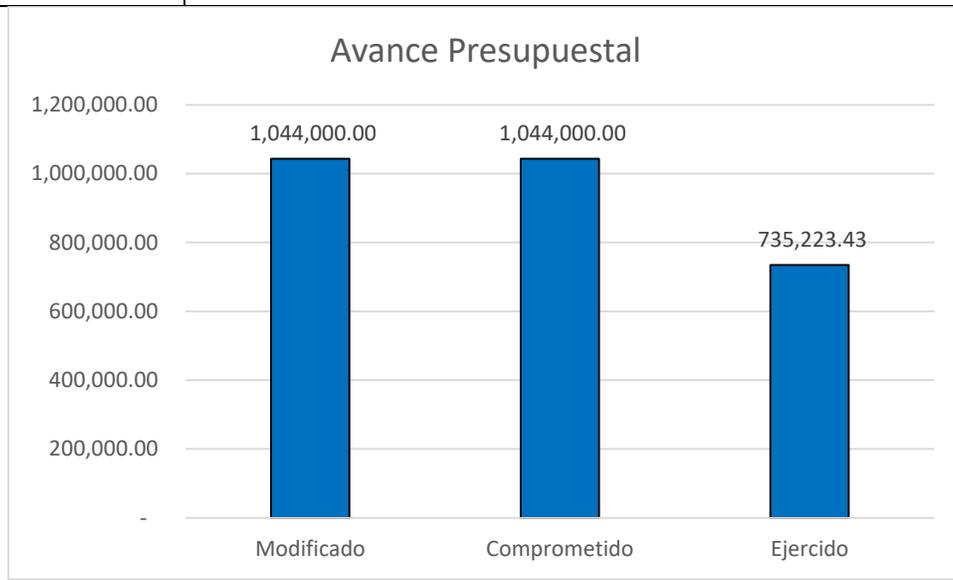

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

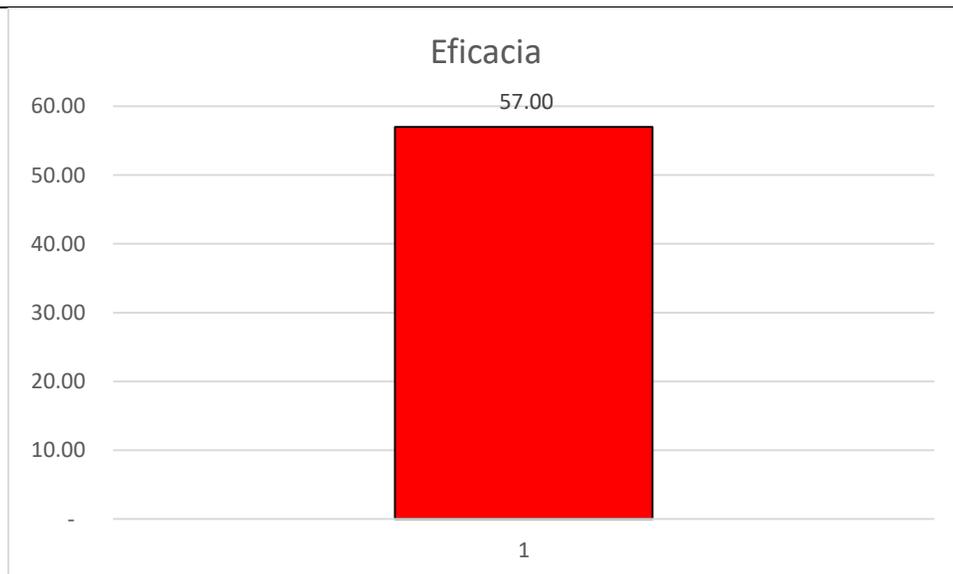

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social


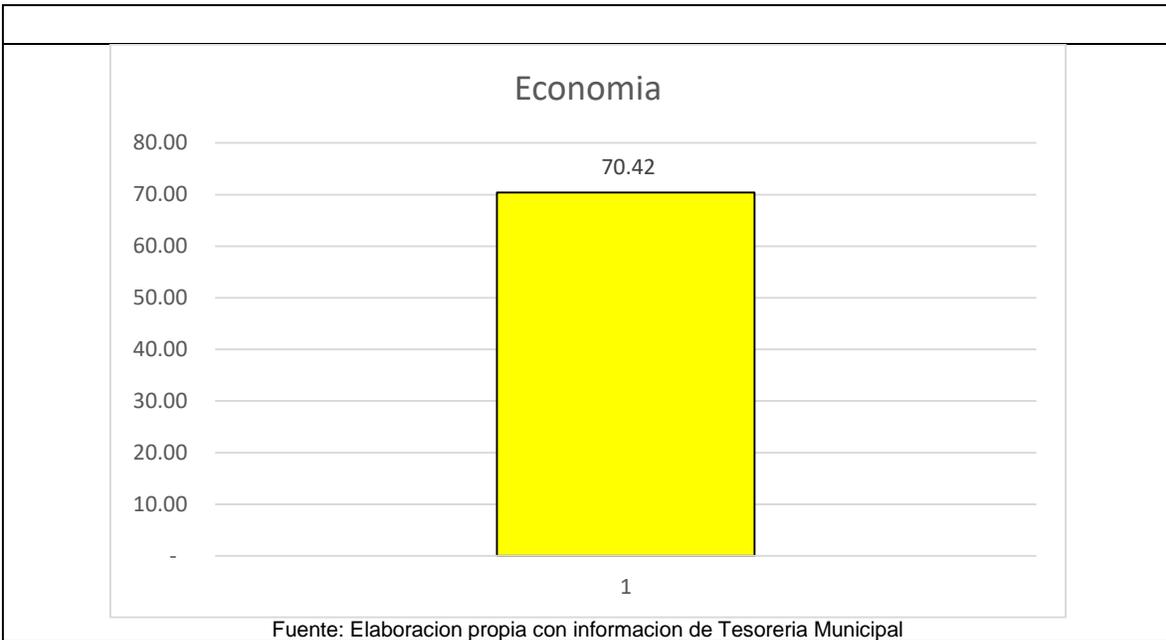


**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 57%</li> </ul>	Eficacia < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ATENCION OPERACIONAL</b> se tuvo un resultado del 70.42%</li> </ul>	85% > Economía > 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 80.94%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:




<b>Nombre del Programa:</b>	<b>2020-3153 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL</b>
<b>Clave del Pp:</b>	O1811
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	04/05/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	1,044,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	150
<b>Algoritmo del indicador</b>	<b>(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100</b>

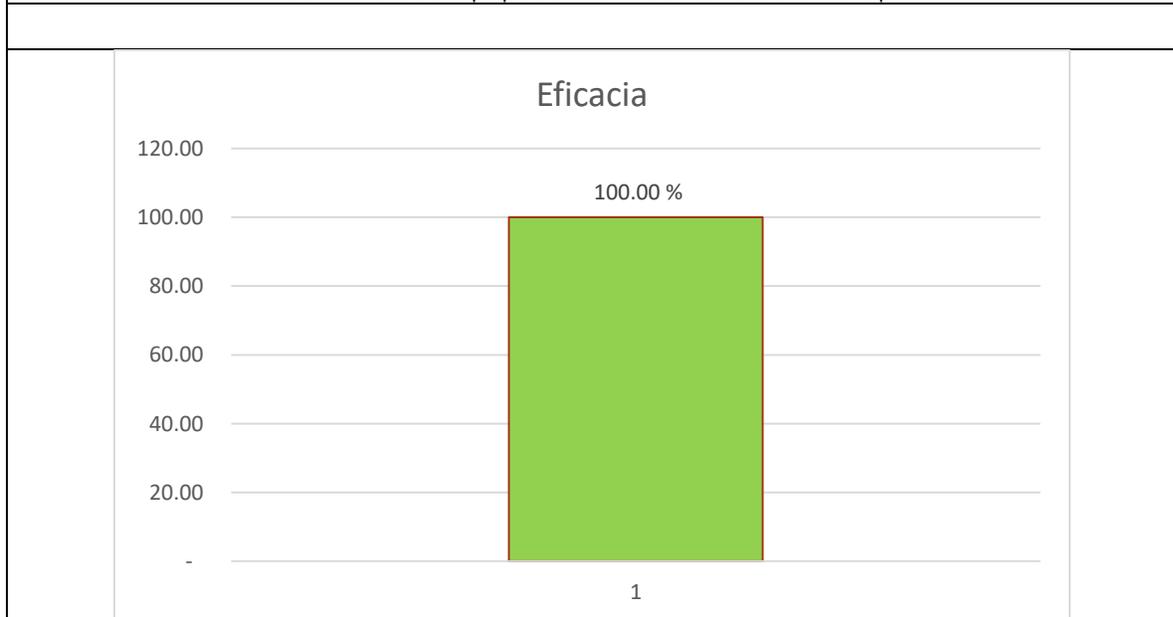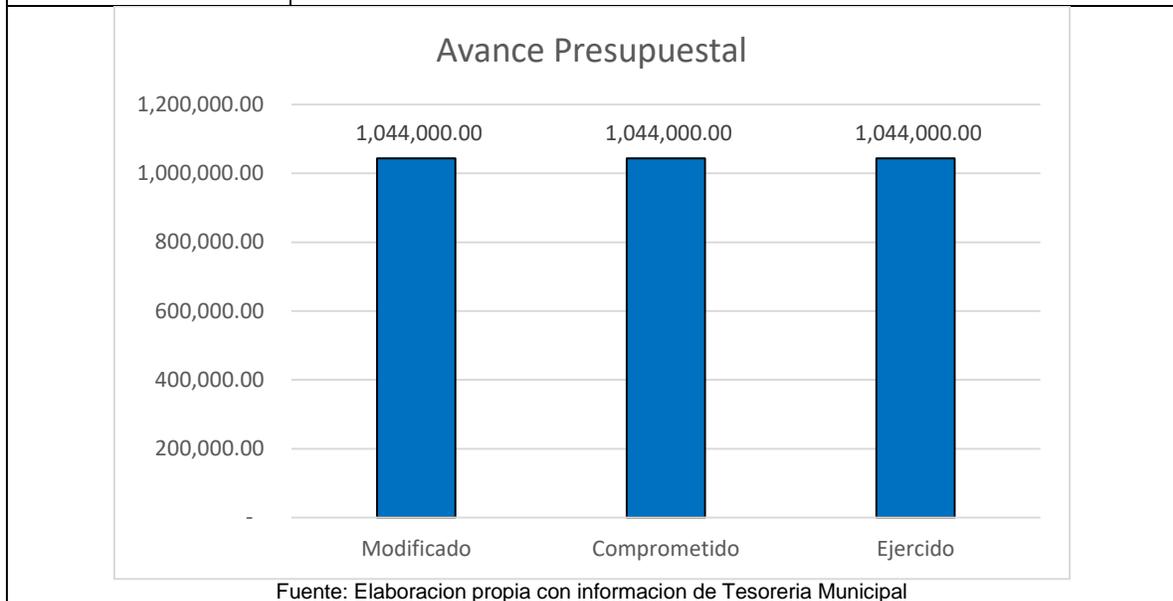




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

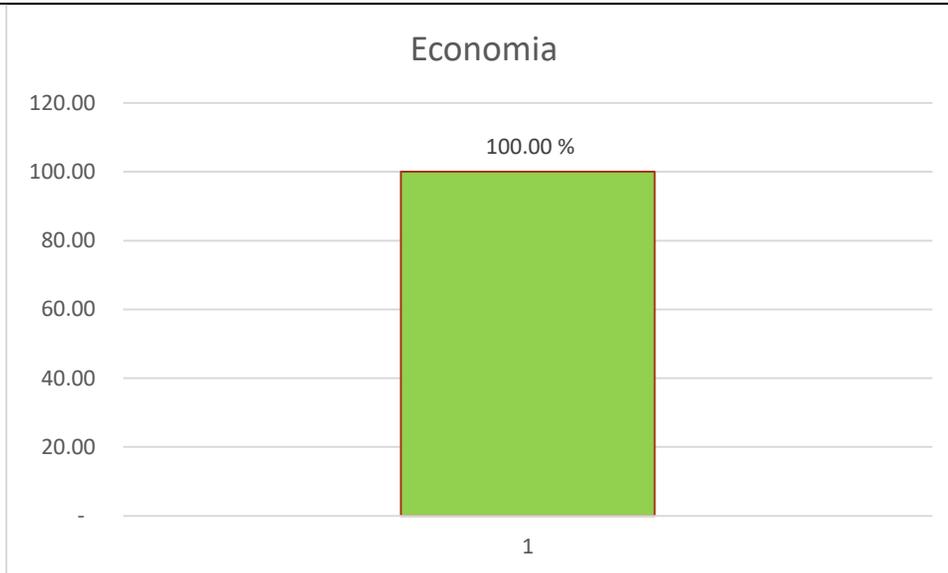

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

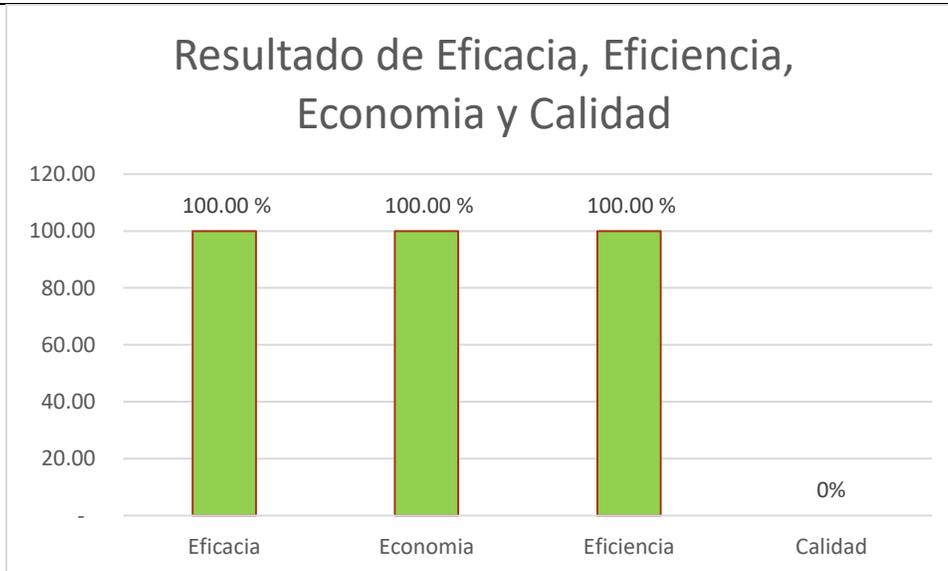


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 65.07%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 153.67%</li> </ul>	Eficacia > 85%: Economía > 85%:



<b>Nombre del Programa:</b>	2020-3154 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 7 EN TAMASOPO
<b>Clave del Pp:</b>	O1815
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	03/08/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	0.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	100
<b>Algoritmo del indicador</b>	$(\text{avance real de la obra} / \text{avance programado de la obra}) \times 100$

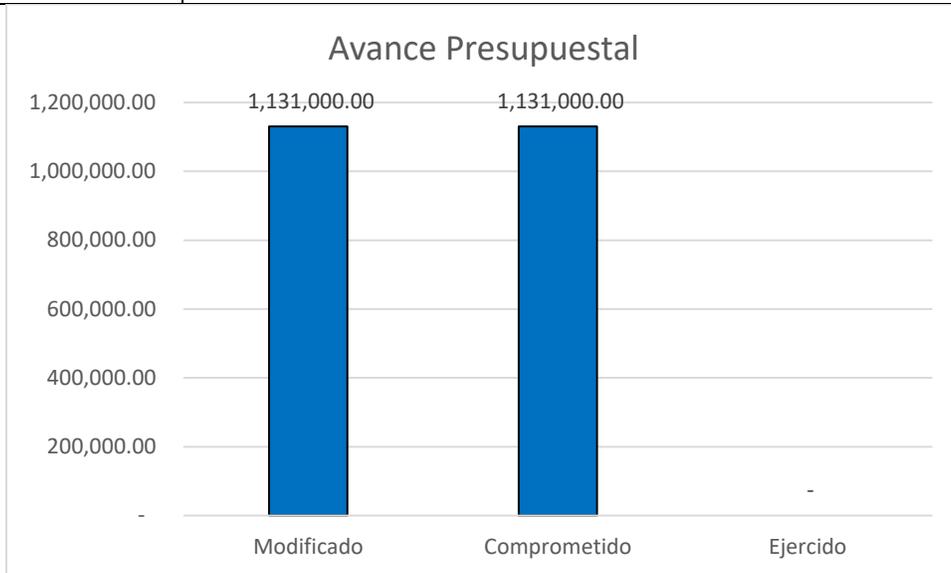


Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

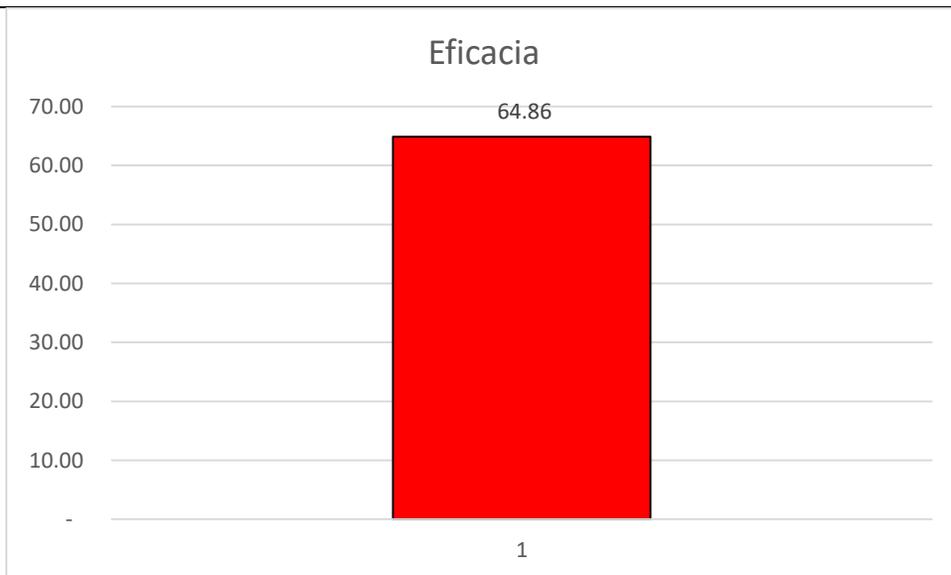



Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social



Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 64.86%</li> </ul>	Eficacia < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado del 0%</li> </ul>	Economía < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 0%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:




<b>Nombre del Programa:</b>	2020-3155 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4.5 mts. EN ZONA 8 - TAMBACA
<b>Clave del Pp:</b>	O1817
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	10/08/2020
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	380,174.76
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	93
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

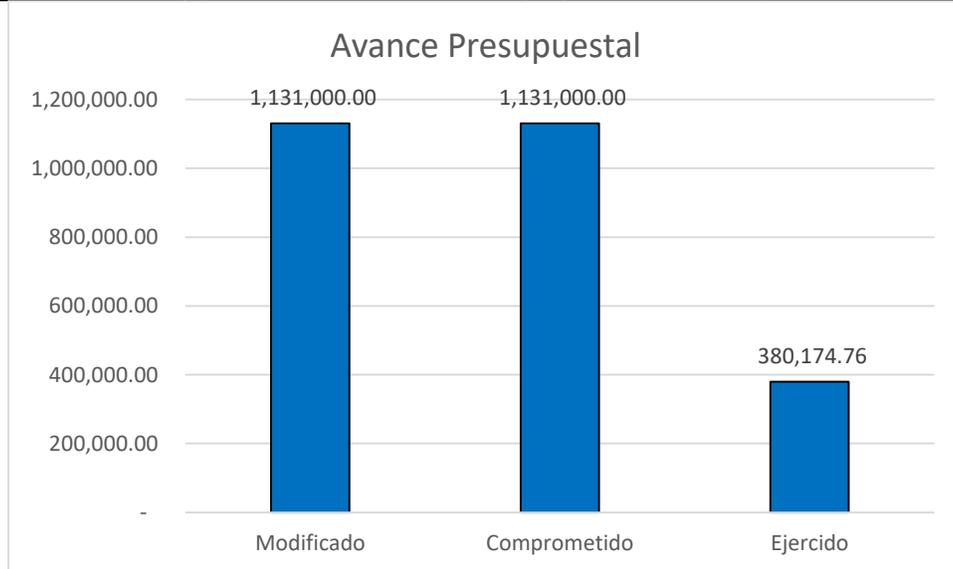

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

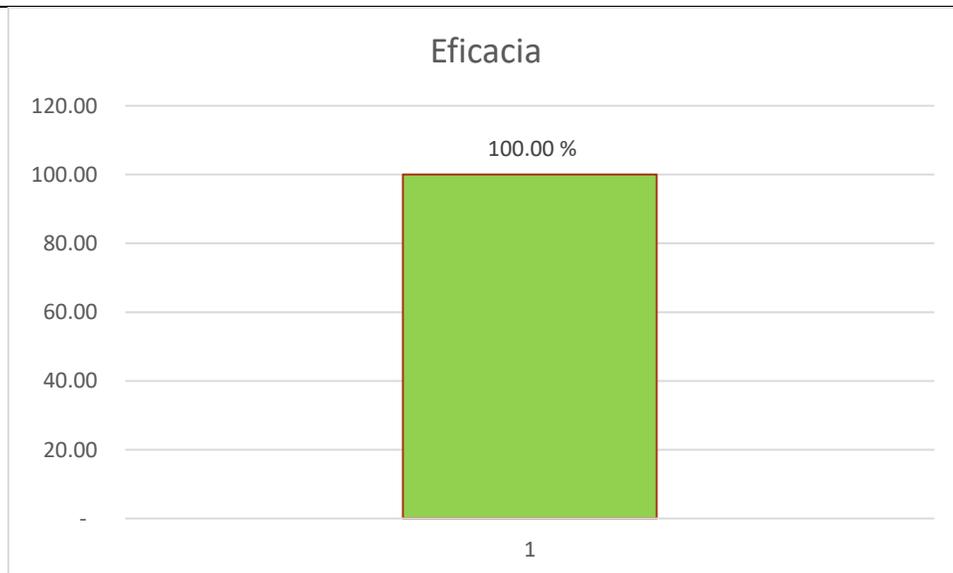

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

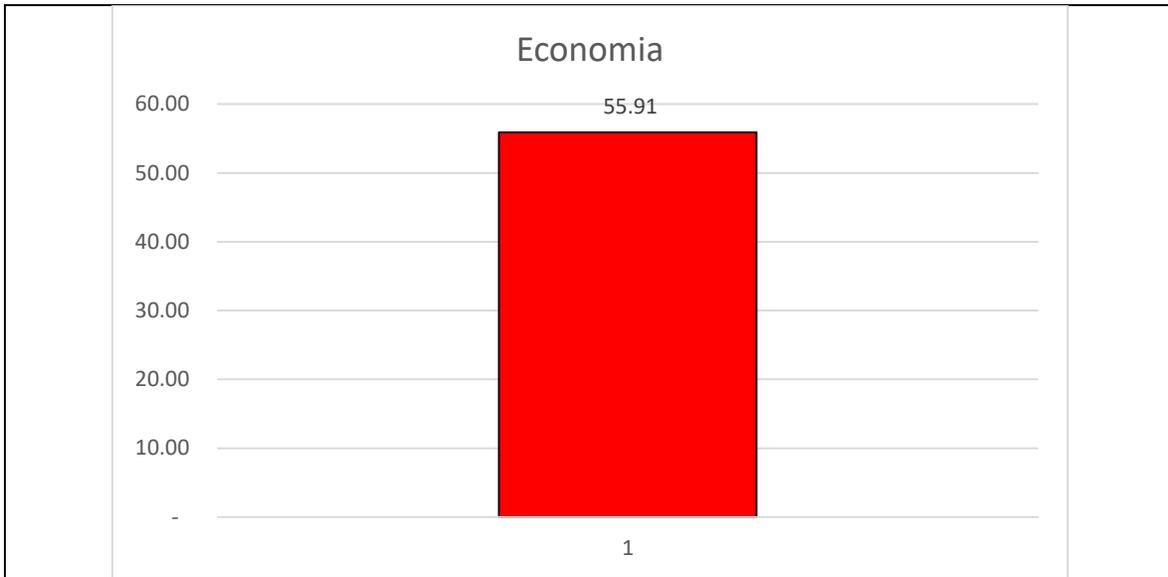


Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.

Presupuesto Modificado / días programados x días del trimestre

1,131,000.00 / 93 x 52 = Presupuesto Modificado = 632,387.10

Economía = 55.91%

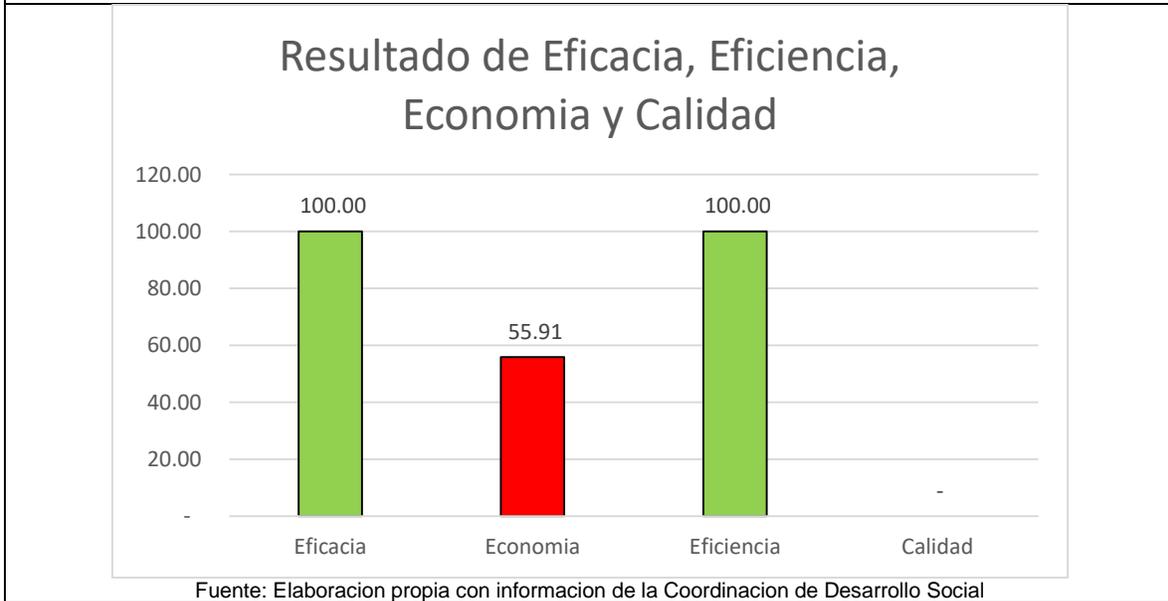


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado del 55.91%</li> </ul>	Economía < 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:




<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2039 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION
<b>Clave del Pp:</b>	O1203
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	01/01/2020
<b>Objetivo:</b>	Aumentar la calidad educativa de las escuelas del municipio, mediante la suma de esfuerzos por parte de las autoridades educativas. el personal docente. los padres de familia y el alumnado, con el fin de lograr la correcta implementación de los programas y acciones instrumentados e implementados por las autoridades estatales y federales de la materia
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	413,100.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	366
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

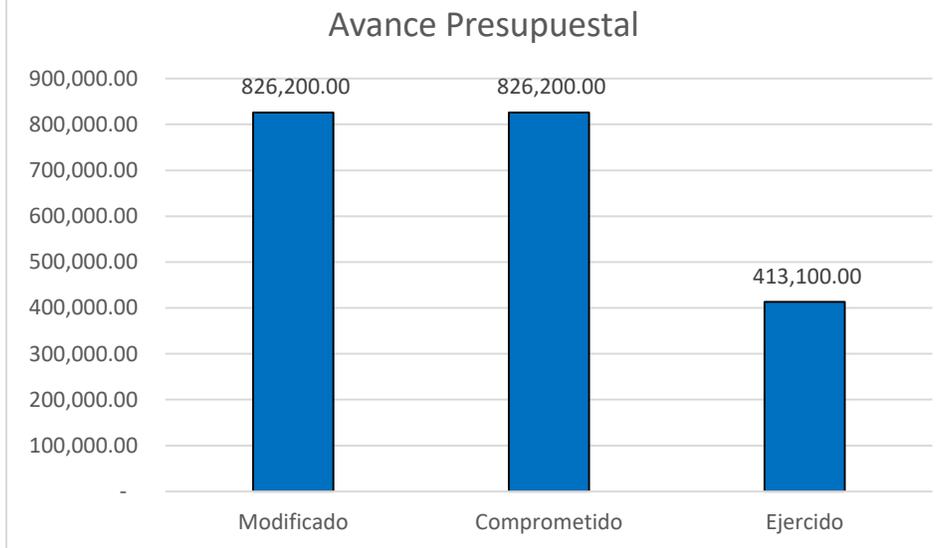

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

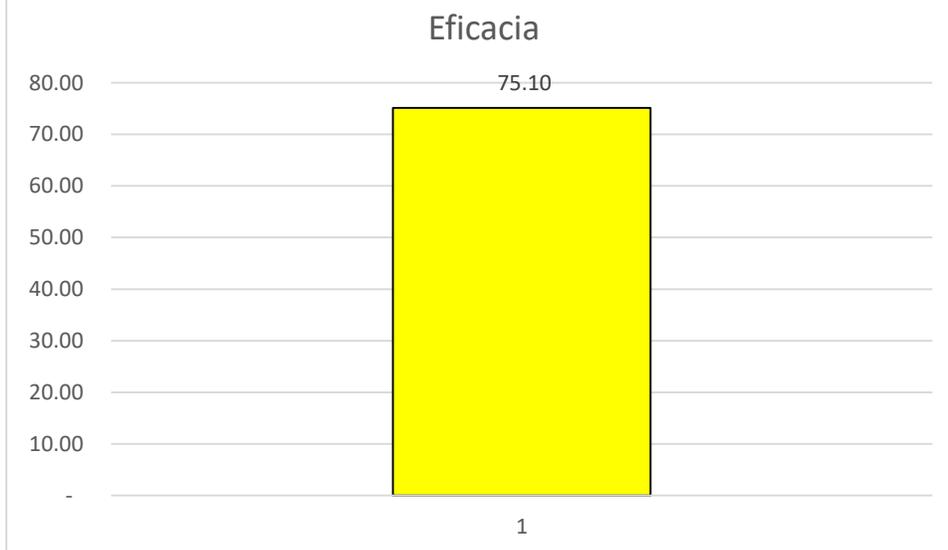


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

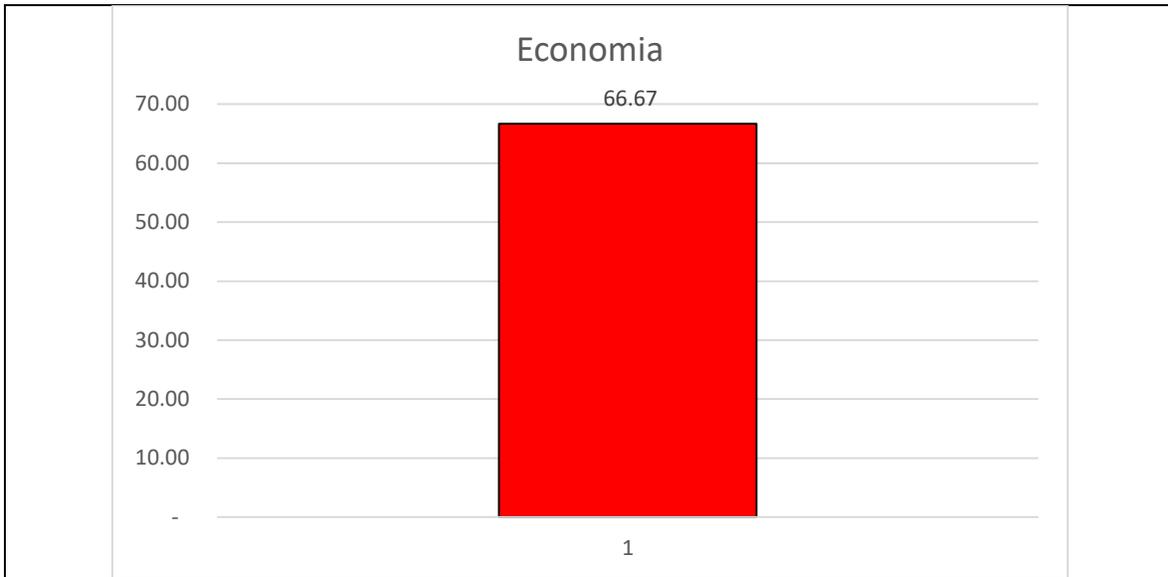

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.  
Presupuesto Modificado / 4 trimestres x 3 trimestres

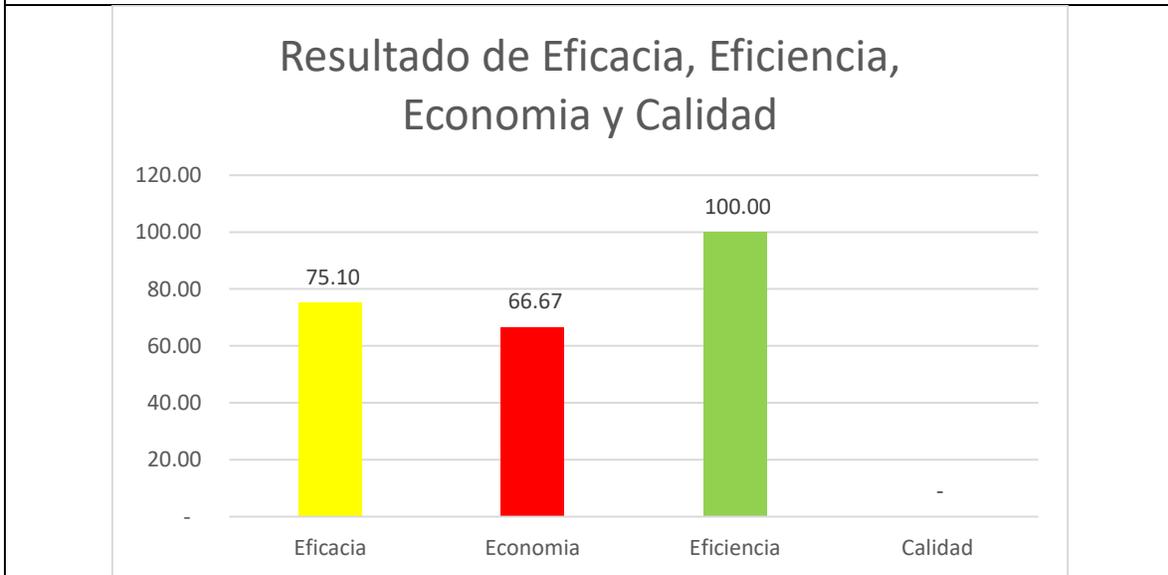


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ATENCION OPERACIONAL</b> se tuvo un resultado de 75.10%</li> </ul>	85% > Eficacia > 70%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado del 70.42%</li> </ul>	Economía < 70%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>DEFICIENTE</b> se tuvo un resultado de 0%</li> </ul>	Eficacia < 70%: Economía < 75%:



<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.
<b>Clave del Pp:</b>	O1201
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	24/02/2020
<b>Objetivo:</b>	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	950,550.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	312
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

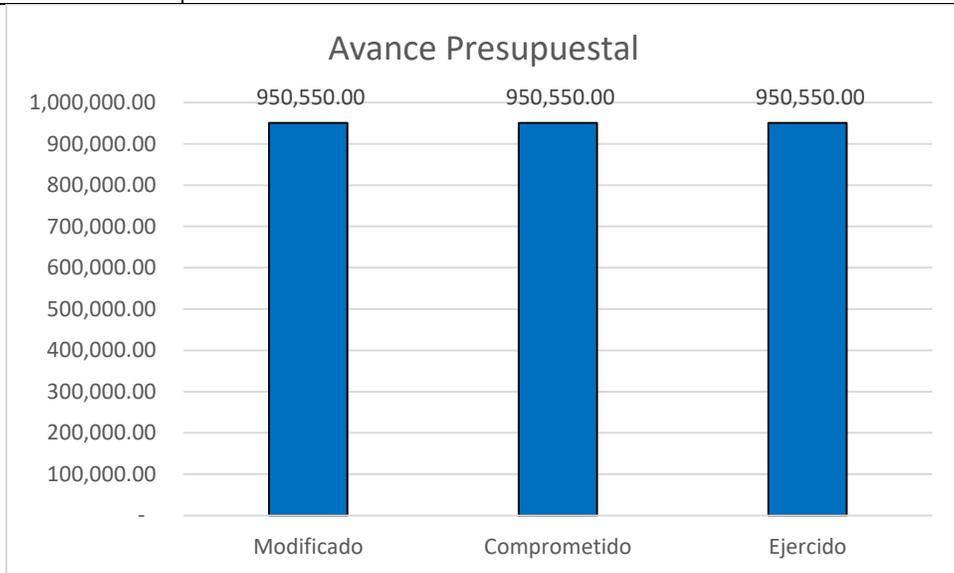


Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

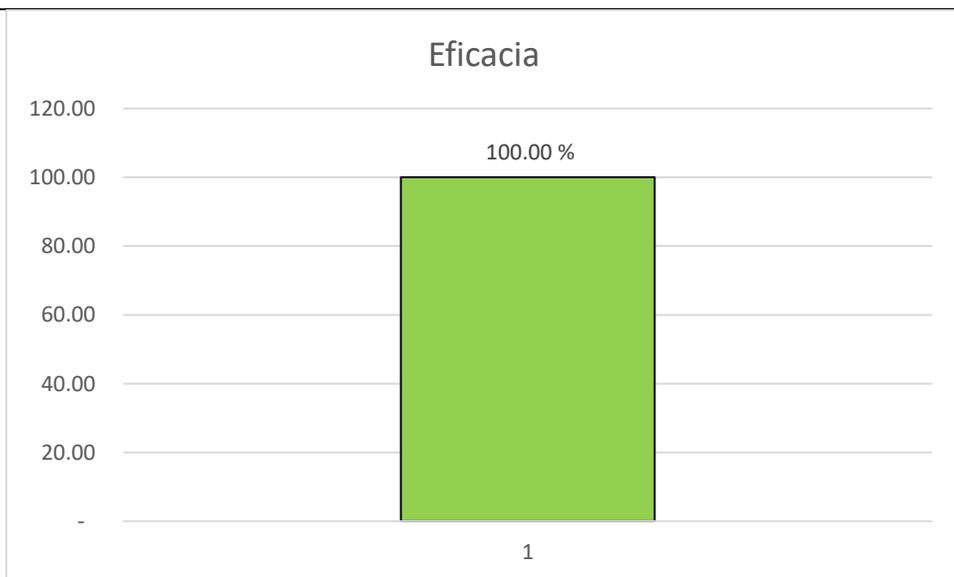




Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

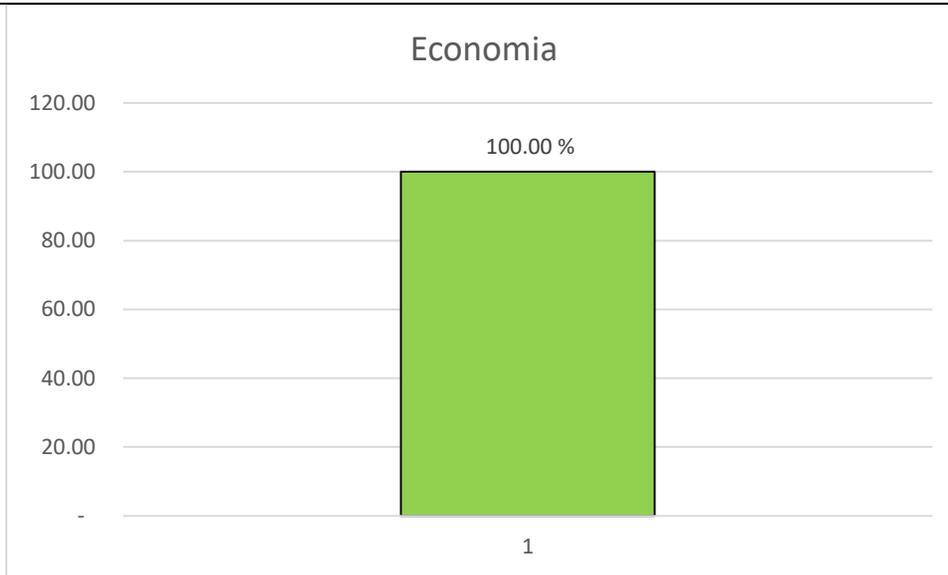

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

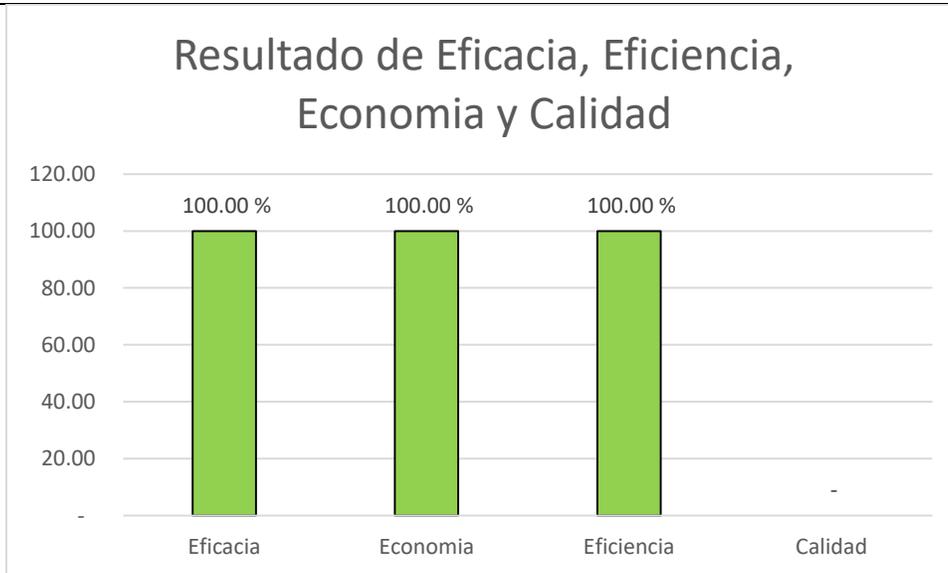

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social


**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%




<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO
<b>Clave del Pp:</b>	O1202
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	01/01/2020
<b>Objetivo:</b>	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	1,147,000.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	182
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

Avance Programatico

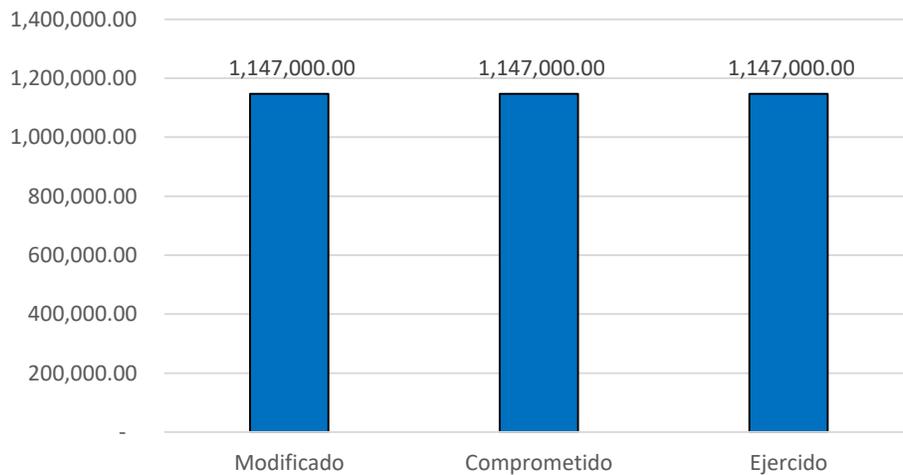


Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

Eficacia



Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

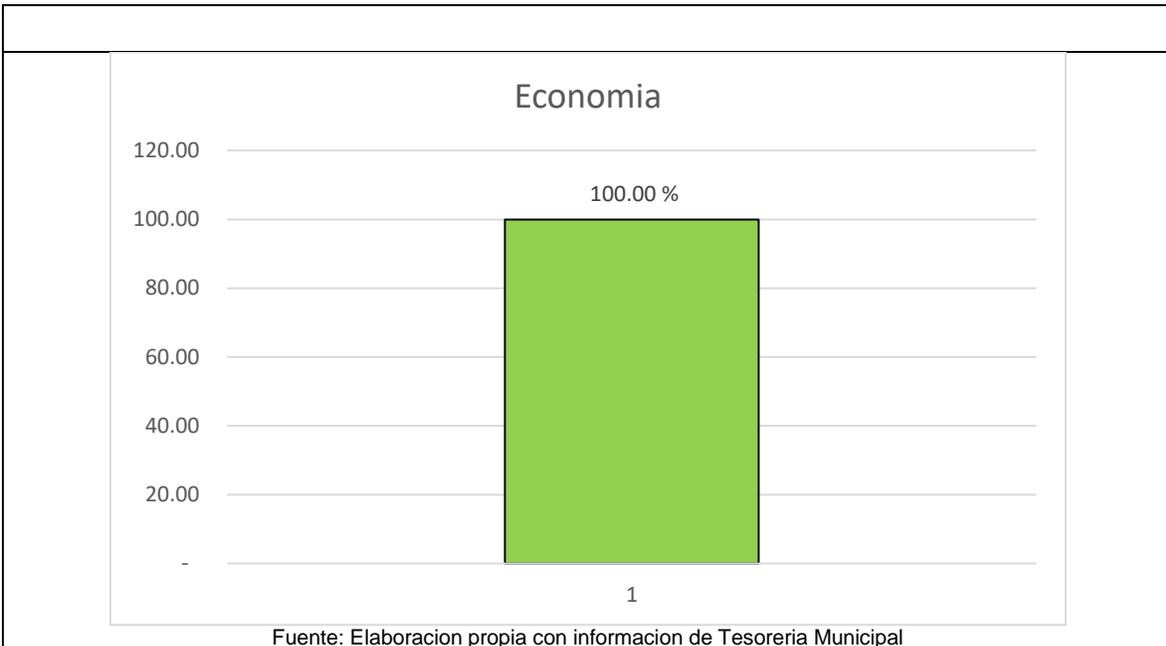


Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:


<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	Eficacia > 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado del 100%</li> </ul>	Economía => 85%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ADECUADO</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	125% > Eficiencia >85%




<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2158 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA SUR-TAMASOPO
<b>Clave del Pp:</b>	O1206
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	03/08/2020
<b>Objetivo:</b>	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población
<b>Monto ejercido al 30 de septiembre de 2020</b>	330,600.00
<b>Días programados para efectuar el proyecto</b>	150
<b>Algoritmo del indicador</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100

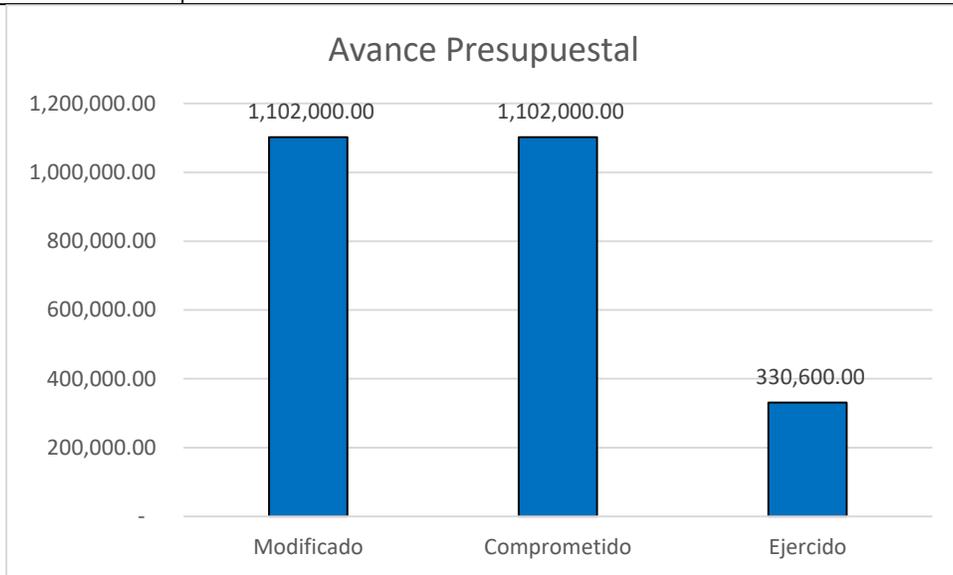

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

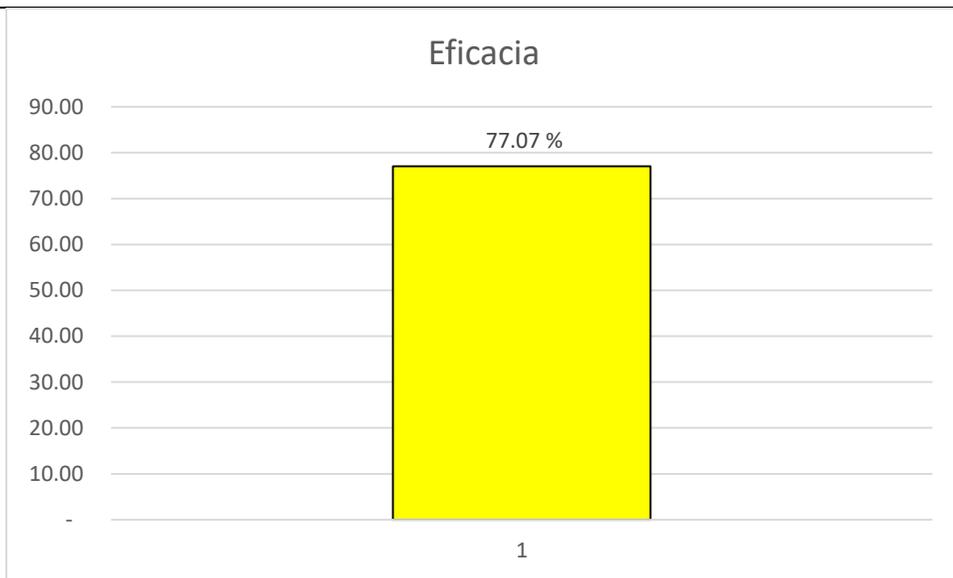


Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social



Fuente: Elaboracion propia con informacion de Tesoreria Municipal

Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.  
Presupuesto Modificado / días programados x días del trimestre

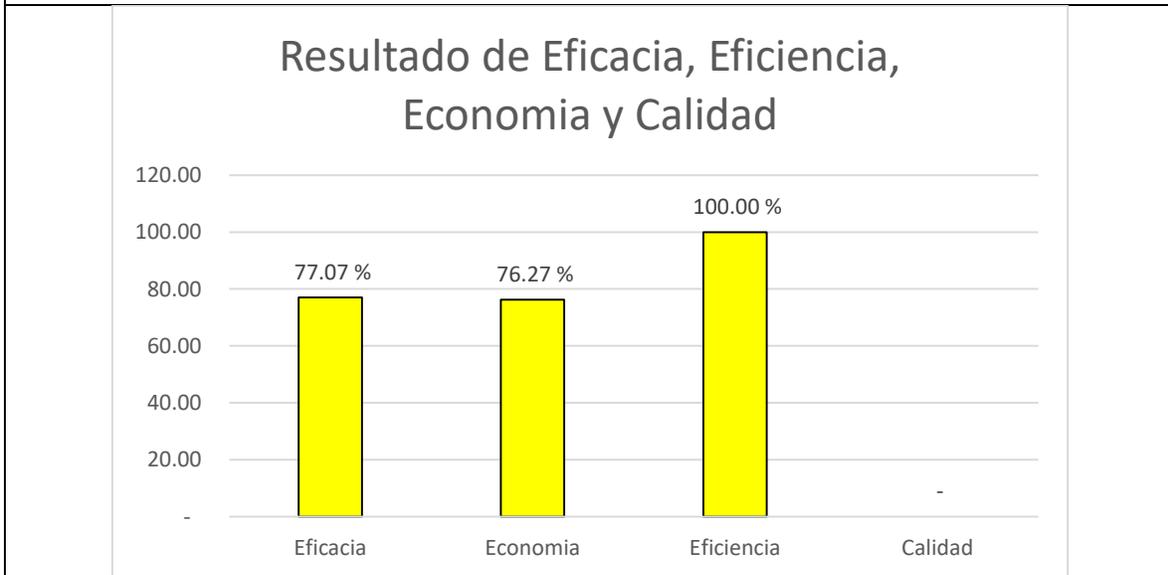

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Coordinacion de Desarrollo Social

**Para el presente proyecto se concluyen los siguientes resultados:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICACIA</b> Para la valoración de cumplimiento de las metas y/objetivos el resultado es <b>ATENCIÓN OPERACIONAL</b> se tuvo un resultado de 77.07%</li> </ul>	85% > Eficacia > 70%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECONOMIA</b> Para la valoración de la Unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros el resultado es <b>ATENCIÓN OPERACIONAL</b> se tuvo un resultado del 76.27%</li> </ul>	85% > Economía > 70%:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EFICIENCIA</b> Para el logro de objetivos del programa presupuestarios (Pp) el resultado es <b>ATENCIÓN OPERACIONAL</b> se tuvo un resultado de 100%</li> </ul>	85% < Eficacia => 70%
	85% < Economía => 70%



### 8.- Valoración general de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

En base al Análisis y Resultados anteriores se presenta una valoración general de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

N°	Fondo o Pp	Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad
1	2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
2	2020-2071 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 2 AGUA PUERCA	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
3	2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
4	2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
5	2020-2282 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE EL VIEJO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
6	2020-2558 AMPLIACION DE BANQUETA TAMASOPO-AGUA BUENA EN TAMASOPO	Adecuado	Deficiente	Deficiente	Deficiente
7	2020-2571 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE EN TAMASOPO	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Deficiente
8	2020-3150 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL	Deficiente	Deficiente	Atención Operacional	Deficiente
9	2020-3153 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
10	2020-3154 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 7 EN TAMASOPO	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Deficiente
11	2020-3155 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4.5 mts. EN ZONA 8 - TAMBACA	Adecuado	Deficiente	Deficiente	Deficiente
12	2020-2039 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	Atención Operacional	Deficiente	Deficiente	Deficiente
13	2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
14	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Deficiente
15	2020-2158 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA SUR-TAMASOPO	Atención Operacional	Atención Operacional	Atención Operacional	Deficiente



**9.- Seguimiento. - Aspectos Susceptibles de Mejora**

Artículo 40. Las Unidades Administrativas deberán atender de manera trimestral y/o anual los resultados de las evaluaciones y los ASM (Anexo 2); ya que son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el Subsistema de Seguimiento y de Evaluación.

Lo anterior a fin de lograr la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador interno y/o externo y contribuir en la optimización del desempeño de los Pp y de las políticas públicas.

En base a lo anterior se solicita lo siguiente:

ASM 1.-	Establecer mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población
ASM 2.-	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno

**Elaboró**

---

**Ing. Juan Pedro Martínez Montoya**

Director de Planeación  
y Evaluación de  
Desempeño

Tamasopo, S.L.P., a 31 de Octubre de 2020.

Anexo:

- Formato 1 Fichas de Monitoreo por Pp
- Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE		
<b>Clave del Pp:</b>	O1806		
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	06/04/2020		
<b>Eje de Gobierno:</b>	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
<b>Línea Estratégica:</b>	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiuy.		
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'uy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
<b>Unidad Responsable:</b>	CODESOL		
<b>Clasificación Económica:</b>	Gasto de Capital		
<b>Tipo de Financiamiento:</b>	Ramo 33 FISM		
<b>Partida Presupuestal:</b>	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	870,000.00	870,000.00	100.00%
<b>3er Trimestre</b>	870,000.00	870,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	86.47%	86.47%	0%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	0%
<b>4to Trimestre</b>			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>		Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 1 agua buena, joya de la esperanza y huizache						
<b>Tipo de Indicador:</b>		Estratégico						
<b>Algoritmo:</b>		(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100						
<b>Comportamiento:</b>		Ascendente						
<b>Línea Base</b>		<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>			
		N/A	Cuarto dormitorio	2020	julio			
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	57.82%	50.00%	86.47%	86.47%	100.00%	0%
		<b>3er</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: **CODESOL**

Programa presupuestario (Pp): **2020-2070 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 1 AGUA BUENA, JOYA DE LA ESPERANZA Y HUIZACHE**

Tipo de Evaluación: **de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad**

Datos del Enlace: **Zamudio Gil Diego Alejandro**

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2071 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 2 AGUA PUERCA		
Clave del Pp:	O1807		
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiiuy.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xiiuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	1,218,000.00	.00	.00%
3er Trimestre	1,218,000.00	1,218,000.00	100.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	34.59%	.00%	0%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 2 agua puerca							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	agosto				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 100.00 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	57.82%	20.00%	34.59%	.00%	.00%	0%
		3er	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	4to							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-2021 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 2 AGUA PUERCA  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) Lo				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO		
Clave del Pp:	O1808		
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiituy.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xiituy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	1,218,000.00	1,080,623.39	88.72%
3er Trimestre	1,218,000.00	1,218,000.00	100.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	100.00%	100.00%	0%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 3 rancho nuevo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	julio				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	57.82%	70.00%	100.00%	100.00%	88.72%	0%
		3er	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	4to							



Anexo 2.  
Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL

Programa presupuestario (Pp): 2020-2072 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 3 RANCHO NUEVO

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2073 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA		
Clave del Pp:	O1809		
Fecha de Alta del Pp:	06/04/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiuy.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'uiy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	1,044,000.00	638,284.99	61.14%
3er Trimestre	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	62.26%	100.00%	0%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construccion de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 4 la manzanilla							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	agosto				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	57.82%	36.00%	62.26%	100.00%	61.14%	0%
		<b>3er</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-2023 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 4 LA MANZANILLA  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) o Justificación del motivo de su				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2282 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE EL VIEJO		
Clave del Pp:	O1915		
Fecha de Alta del Pp:	01/05/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Identificar las localidades del municipio que no cuenten con infraestructura hidráulica, y gestionar los recursos necesarios ante el Consejo de Desarrollo Social Municipal, e instancias estatales y federales, para la construcción de los sistemas de agua potable, incluida la perforación de pozos profundos.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'iuy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	833,576.00	444,164.00	53.28%
3er Trimestre	833,576.00	833,576.00	100.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	.00%	N/A
2do Trimestre	73.01%	100.00%	0%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construcción de pozo profundo de agua potable en san jose el viejo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	obra	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	65.93%	48.14%	73.01%	100.00%	53.28%	0%
		<b>3er</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
Programa presupuestario (Pp): 2020-2282 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE EL VIEJO  
Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental	
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) Lo					Justificación del motivo de su
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X											CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X												



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2558 AMPLIACION DE BANQUETA TAMASOPO-AGUA BUENA EN TAMASOPO		
Clave del Pp:	O2017		
Fecha de Alta del Pp:	05/08/2020		
Eje de Gobierno:	I. TAMASOPO PROSPERO.		
Línea Estratégica:	· Implantar un programa permanente de creación y mantenimiento de calles, banquetas, andadores, ascensos y descensos, jardines. y demás lugares públicos del municipio.		
Objetivo:	Dotar de infraestructura básica a los espacios públicos de las principales poblaciones del municipio, que permita a la ciudadanía el acceso a la convivencia urbana, la cultura, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho a la ciudad; regular el crecimiento urbano de las poblaciones del municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; así como de proporcionar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos básicos		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	2,204,190.61	.00	.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	94.35%	.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en ampliacion de banquetta tamasopo-agua buena en tamasopo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Metros <sup>2</sup>	2020	septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 37.84 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3er	37.84%	35.70%	94.35%	.00%	.00%	0%
	4to							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-2558 AMPLIACION DE BANQUETA TAMASOPO-AGUA BUENA EN TAMASOPO  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) o Justificación del motivo de su				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2571 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE EN TAMASOPO		
Clave del Pp:	O2018		
Fecha de Alta del Pp:	06/07/2020		
Eje de Gobierno:	I. TAMASOPO PROSPERO.		
Línea Estratégica:	· Implantar un programa permanente de creación y mantenimiento de calles, banquetas, andadores, ascensos y descensos, jardines. y demás lugares públicos del municipio.		
Objetivo:	Dotar de infraestructura básica a los espacios públicos de las principales poblaciones del municipio, que permita a la ciudadanía el acceso a la convivencia urbana, la cultura, la cohesión social y para garantizar la movilidad, sustentabilidad, equidad y el sentido incluyente y democrático de las ciudades, que define el derecho a la ciudad; regular el crecimiento urbano de las poblaciones del municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; así como de proporcionar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos básicos		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	745,068.37	.00	.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	12.53%	.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construccion de pavimentacion de calle iturbide en tamasopo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Metros <sup>2</sup>	2020	Agosto				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 25.86 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>3er</b>	25.86%	3.24%	12.53%	.00%	.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-2571 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE EN TAMASOPO  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) Lo				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa:</b>	2020-3150 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL		
<b>Clave del Pp:</b>	O1810		
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	04/05/2020		
<b>Eje de Gobierno:</b>	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
<b>Línea Estratégica:</b>	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiituy.		
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xiituy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
<b>Unidad Responsable:</b>	CODESOL		
<b>Clasificación Económica:</b>	Gasto de Capital		
<b>Tipo de Financiamiento:</b>	Ramo 33 FISM		
<b>Partida Presupuestal:</b>	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	1,044,000.00	245,469.71	23.51%
<b>3er Trimestre</b>	1,044,000.00	735,223.43	70.42%
<b>4to Trimestre</b>			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
<b>1er Trimestre</b>	N/A	.00%	N/A
<b>2do Trimestre</b>	62.74%	100.00%	0%
<b>3er Trimestre</b>	57.00%	80.94%	0%
<b>4to Trimestre</b>			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construccion de 12 cuartos dormitorios 4x4 zona 5 en rincon de ramirez y huizachal							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	agosto				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	38.26%	24.00%	62.74%	100.00%	23.51%	0%
		<b>3er</b>	100.00%	57.00%	57.00%	80.94%	70.42%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL

Programa presupuestario (Pp): 2020-3150 CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 4X4 ZONA 5 EN RINCON DE RAMIREZ Y HUIZACHAL

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa:</b>	2020-3153 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL		
<b>Clave del Pp:</b>	O1811		
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	04/05/2020		
<b>Eje de Gobierno:</b>	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
<b>Línea Estratégica:</b>	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiituy.		
<b>Objetivo:</b>	Propiciar que los pueblos indígenas Xiituy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
<b>Unidad Responsable:</b>	CODESOL		
<b>Clasificación Económica:</b>	Gasto de Capital		
<b>Tipo de Financiamiento:</b>	Ramo 33 FISM		
<b>Partida Presupuestal:</b>	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	1,044,000.00	679,370.20	65.07%
<b>3er Trimestre</b>	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
<b>1er Trimestre</b>	N/A	.00%	N/A
<b>2do Trimestre</b>	100.00%	100.00%	0%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	0%
<b>4to Trimestre</b>			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 6 en zona 6-divisadero y sabinito tepehuajal							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	38.26%	58.00%	100.00%	100.00%	65.07%	0%
		3er	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	4to							



Anexo 2.  
Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
Programa presupuestario (Pp): 2020-3153 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 6 EN ZONA 6-DIVISADERO Y SABINITO TEPEHUAJAL  
Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-3154 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 7 EN TAMASOPO		
Clave del Pp:	O1815		
Fecha de Alta del Pp:	03/08/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable. drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales. electrificación y vivienda. en las poblaciones Xiuy.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'uiy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	1,131,000.00	.00	.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	64.86%	.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construcción de cuartos dormitorios 4x4.5 mts. zona 7 en Tamasopo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 58.59 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3er	58.59%	38.00%	64.86%	.00%	.00%	0%
	4to							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-3154 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4X4.5 MTS. ZONA 7 EN TAMASOPO  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) Lo				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-3155 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4.5 mts. EN ZONA 8 - TAMBACA		
Clave del Pp:	O1817		
Fecha de Alta del Pp:	10/08/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Gestionar ante el Consejo de Desarrollo Social, y las dependencias federales y estatales responsables, el mejoramiento de la infraestructura básica en salud, educación, agua potable, drenaje, pavimentación de vialidades y caminos rurales, electrificación y vivienda, en las poblaciones Xiuy.		
Objetivo:	Propiciar que los pueblos indígenas Xi'uiy y/o Pame Norte, del municipio de Tamasopo, alcancen el desarrollo personal y económico en igualdad de condiciones que el resto de la población, y los mismos sean reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural municipal, y se preserven y respeten sus usos y costumbres		
Unidad Responsable:	CODESOL		
Clasificación Económica:	Gasto de Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FISM		
Partida Presupuestal:	6111 Edificacion Habitacional		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	1,131,000.00	380,174.76	33.61%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en construccion de cuartos dormitorios 4 x 4.5 mts. en zona 8 - tambaca							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(avance real de la obra / avance programado de la obra ) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Cuarto dormitorio	2020	septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD PROGRAMADA				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 55.43 %				
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3er	55.43%	57.00%	100.00%	100.00%	33.61%	0%
	4to							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: CODESOL  
 Programa presupuestario (Pp): 2020-3155 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4.5 mts. EN ZONA 8 - TAMBACA  
 Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad  
 Datos del Enlace: Zamudio Gil Diego Alejandro

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) o Justificación del motivo de su				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										CODESOL	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2039 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION		
Clave del Pp:	O1203		
Fecha de Alta del Pp:	01/01/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Mejorar el rendimiento académico y evitar la deserción escolar en la población de alta marginación del municipio, a través del fortalecimiento y ampliación del programa Estímulos a la Educación Básica.		
Objetivo:	Aumentar la calidad educativa de las escuelas del municipio, mediante la suma de esfuerzos por parte de las autoridades educativas, el personal docente, los padres de familia y el alumnado, con el fin de lograr la correcta implementación de los programas y acciones instrumentados e implementados por las autoridades estatales y federales de la materia		
Unidad Responsable:	DIRECCION DE ESTIMULOS A LA EDUCACION		
Clasificación Económica:	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FORTAMUN		
Partida Presupuestal:	442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	.00	.00	.00%
3er Trimestre	826,200.00	413,100.00	50.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	.00%	.00%	0%
3er Trimestre	75.10%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>		<b>Eficacia en entrega de estímulos a la educación</b>						
<b>Tipo de Indicador:</b>		<b>Estratégico</b>						
<b>Algoritmo:</b>		<b>(entrega de becas / entrega de becas programadas) X 100</b>						
<b>Comportamiento:</b>		<b>Ascendente</b>						
<b>Línea Base</b>		<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>			
		N/A	Becas	2020	Agosto			
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 66.58 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	49.59%	%	.00%	.00%	.00%	0%
		<b>3er</b>	66.58%	50.00%	75.10%	100.00%	50.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: DIRECCION DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

Programa presupuestario (Pp): 2020-2039 PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Enriquez Sanchez Ma. De Los Angeles

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM			ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental	
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal					Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										DIRECCION DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.		
Clave del Pp:	O1201		
Fecha de Alta del Pp:	24/02/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Identificar a las familias que habiten dentro del municipio que se encuentren en condiciones vulnerables.		
Objetivo:	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población		
Unidad Responsable:	SMDIF		
Clasificación Económica:	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FORTAMUN		
Partida Presupuestal:	4411 Ayudas Sociales a Personas		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	950,550.00	950,550.00	100.00%
3er Trimestre	950,550.00	950,550.00	100.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	73.46%	73.46%	0%
3er Trimestre	100.00%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en apoyo directo a grupos vulnerables en las localidades del municipio de Tamasopo, S.L.P.							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	(entrega de apoyos / entrega de apoyos programados) X 100							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Apoyos	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 70.42 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	40.84%	30.00%	73.46%	73.46%	100.00%	0%
		<b>3er</b>	70.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	<b>4to</b>							



Anexo 2.  
Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: **SMDIF**  
 Programa presupuestario (Pp): **2020-2037 APOYO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.**  
 Tipo de Evaluación: **de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad**  
 Datos del Enlace: **Chavira Alvarado Estuardo**

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) o Justificación del motivo de su				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										SMDIF	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
<b>Nombre del Programa:</b>	2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO		
<b>Clave del Pp:</b>	O1202		
<b>Fecha de Alta del Pp:</b>	01/01/2020		
<b>Eje de Gobierno:</b>	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
<b>Línea Estratégica:</b>	· Identificar a las familias que habiten dentro del municipio que se encuentren en condiciones vulnerables.		
<b>Objetivo:</b>	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población		
<b>Unidad Responsable:</b>	SMDIF		
<b>Clasificación Económica:</b>	Gasto Corriente		
<b>Tipo de Financiamiento:</b>	Ramo 33 FORTAMUN		
<b>Partida Presupuestal:</b>	4411 Ayudas Sociales a Personas		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	1,147,000.00	688,200.00	60.00%
<b>3er Trimestre</b>	1,147,000.00	1,147,000.00	100.00%
<b>4to Trimestre</b>			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
<b>1er Trimestre</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2do Trimestre</b>	60.00%	100.00%	0%
<b>3er Trimestre</b>	100.00%	100.00%	0%
<b>4to Trimestre</b>			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	Eficacia en entrega de despensas a grupos vulnerables zona norte en Tamasopo							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico							
<b>Algoritmo:</b>	$(\text{entrega de despensas} / \text{entrega de despensas programadas}) \times 100$							
<b>Comportamiento:</b>	Ascendente							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Despensas	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>			
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real				Avance físico del 100.00 %			
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	60.00%	0%
		3er	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%
	4to							



Anexo 2.  
Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: SMDIF

Programa presupuestario (Pp): 2020-2038 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA NORTE EN TAMASOPO

Tipo de Evaluación: de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad

Datos del Enlace: Chavira Alvarado Estuardo

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal	Nombre(s) de la(s) Dependencia(s) o Justificación del motivo de su				
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										SMDIF	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 2020			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	2020-2158 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA SUR-TAMASOPO		
Clave del Pp:	O1206		
Fecha de Alta del Pp:	03/08/2020		
Eje de Gobierno:	II.- TAMASOPO INCLUYENTE.		
Línea Estratégica:	· Identificar a las familias que habiten dentro del municipio que se encuentren en condiciones vulnerables.		
Objetivo:	Atender a las familias del municipio de Tamasopo, que se encuentren en estado vulnerable, para que sus integrantes alcancen un desarrollo integral, tanto mental como físicamente, que les permita estar en igualdad de condiciones que el resto de la población		
Unidad Responsable:	SMDIF		
Clasificación Económica:	Gasto Corriente		
Tipo de Financiamiento:	Ramo 33 FORTAMUN		
Partida Presupuestal:	4411 Ayudas Sociales a Personas		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	1,102,000.00	330,600.00	30.00%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	N/A	N/A	N/A
3er Trimestre	77.07%	100.00%	0%
4to Trimestre			
COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES			



<b>Nombre:</b>	<b>Eficacia en entrega bimestral de despensas a grupos vulnerables zona sur-tamasopo</b>							
<b>Tipo de Indicador:</b>	<b>Estratégico</b>							
<b>Algoritmo:</b>	<b>(entrega de despensas / entrega de despensas programadas) X 100</b>							
<b>Comportamiento:</b>	<b>Ascendente</b>							
<b>Línea Base</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>				
	N/A	Despensas	2020	septiembre				
<b>NIVEL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>CANTIDAD PROGRAMADA</b>				
Sin especificar	Nivel de avance físico programado vs avance físico real			Avance físico del 38.93 %				
	<b>ID INDICADOR</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>ECONOMÍA</b>	<b>CALIDAD</b>
		<b>1er</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>2do</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>3er</b>	38.93%	30.00%	77.07%	100.00%	30.00%	0%
	<b>4to</b>							



**Anexo 2.**  
**Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**

Nombre de la Dependencia/Entidad/Organismo: **SMDIF**

Programa presupuestario (Pp): **2020-2158 PROGRAMA BIMESTRAL DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES ZONA SUR-TAMASOPO**

Tipo de Evaluación: **de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad**

Datos del Enlace: **Chavira Alvarado Estuardo**

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM			ASM Interinstitucional o Intergubernamental				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental	
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental	Federal	Estatal	Municipal					Nombre(s) de la(s) Dependencia(s)
Calidad	1	Establece mecanismos que permitan medir la calidad de los bienes y servicios proporcionados a la población	X			X										SMDIF	
Entrega de Información	2	Proporcionar la documentación solicitada entiendo y forma a este Órgano de Control Interno	X			X											
